

SEVEN-G

Empresa · Autoconsultoría

Qué es SEVEN-G, cómo se llena el embudo de iniciativas hasta el panel del consejo y cómo implantarlo en su compañía por sus propios medios.

El problema que resuelve

- Muchas compañías tienen pilotos de IA que funcionan, pero pocos llegan a producción.
- El valor se declara («liberamos 200 horas») y casi nadie lo comprueba.
- Nadie tiene autoridad clara para parar una iniciativa que no funciona.
- El consejo pregunta por la IA y recibe una lista de proyectos técnicos, no decisiones de negocio.
- ¿La compañía se está transformando con IA, o solo es un poco más eficiente? Casi nadie puede contestarlo con evidencia.

No es un problema de tecnología: es un problema de gobierno y de medición.

Qué es SEVEN-G y qué aporta

- Seven-phase Enterprise Value & Governance: una fase 0 habilitante y siete fases de valor, con gobierno en todas.
- Ordena la IA como una cartera: cada iniciativa tiene fase, coste, valor esperado y responsable.
- Pone puertas de decisión entre las fases: sin evidencia verificada no se avanza.
- Separa quién decide, quién construye y quién controla, y traduce la regulación a fases, roles y evidencias.
- Mide el valor en dinero y con estado —validado, declarado o estimado— y se lo enseña al consejo en un panel.
- Es gratuito y modificable: documentos, plantillas en Word y herramientas, con licencia abierta.

Dos niveles: la compañía y cada iniciativa

- C1 · Diagnóstico: inventario, madurez en siete dimensiones e índice de transformación.
- C2 · Dirección: el consejo aprueba la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo.
- C3 · Cartera: qué iniciativas se financian y en qué orden.
- C4 · Supervisión: panel del consejo y registro de decisiones y recomendaciones.
- C5 · Revisión anual: qué funcionó, qué no y qué cambia.
- Y, dentro de esa cartera, cada iniciativa recorre su propio ciclo de vida de ocho fases.

El ciclo de vida de una iniciativa

Ocho fases con una puerta de decisión al final de cada una; debajo, la etapa del embudo en la que se ve cada fase



Qué puede pasar en cada puerta

Cinco resultados; quien aporta la evidencia nunca es quien verifica ni quien decide

Continuar	Con condiciones	Iterar	Pivotar	Parar
Se cumplen todos los criterios y las evidencias están verificadas: pasa a la fase siguiente.	Pasa, con plazo y responsable para lo pendiente. Nunca para controles críticos de seguridad, legales o de supervisión humana.	Se repite la fase con un ajuste concreto y se vuelve a la misma puerta. A la tercera, decide el órgano superior.	La hipótesis no se sostiene pero hay otra razonable: vuelve a la fase 2. Solo en G1, G2 y G3.	No hay valor plausible o el riesgo es inaceptable. Se registran el motivo y lo aprendido. Es un buen resultado.

En G7 los resultados son Escalar, Iterar o Retirar.

■ DEL DOCUMENTO AL PANEL

Cómo se llena el embudo

Nadie dibuja el embudo ni el panel: salen solos de lo que se rellena y se decide en cada fase. Este es el recorrido.

Fases 0 a 3: de la idea a la prueba de concepto


Qué se hace, qué plantillas se rellenan y qué puerta cierra cada fase

F0 Contexto y restricciones	F1 Descubrimiento	F2 Hipótesis de valor	F3 Viabilidad y riesgo
Qué se hace. Se autoriza la idea: patrocinador, responsable, alcance, restricciones e intensidad (Lite o Enterprise). Se rellena. P01 Carta de la iniciativa · P02 Contexto y restricciones · P03 Roles · P04 Intensidad · P05 Alta en el inventario.	Qué se hace. Se comparan oportunidades, también alternativas sin IA, y se propone esfera y nivel de ambición. Se rellena. P06 Cartera de oportunidades y filtrado · P07 Esfera y ambición · P31 Ficha de caso de uso.	Qué se hace. Hipótesis falsable en dinero, con línea base, método de atribución y criterios de parada fijados antes de empezar. Se rellena. P08 Lienzo de hipótesis de valor · P09 Línea base. Apoyo: calculadora T11.	Qué se hace. Prueba de concepto: viabilidad, clasificación regulatoria, riesgos y proveedores. Es la principal puerta de parada. Se rellena. P10 Viabilidad · P11 Clasificación regulatoria e impacto · P12 Riesgos · P13 Mitigación · P14 Proveedor.
G0 → entra en «Propuesto»	G1 → sigue en «Propuesto»	G2 → «Hipótesis de valor»	G3 → «Prueba de concepto»

Cada decisión de puerta se deja en P29 y en el registro T01, con el estado de cada criterio y su evidencia.

Fases 4 a 7: del diseño a la producción y la retirada

La puesta en producción no cierra el ciclo: abre la operación, con revisiones periódicas

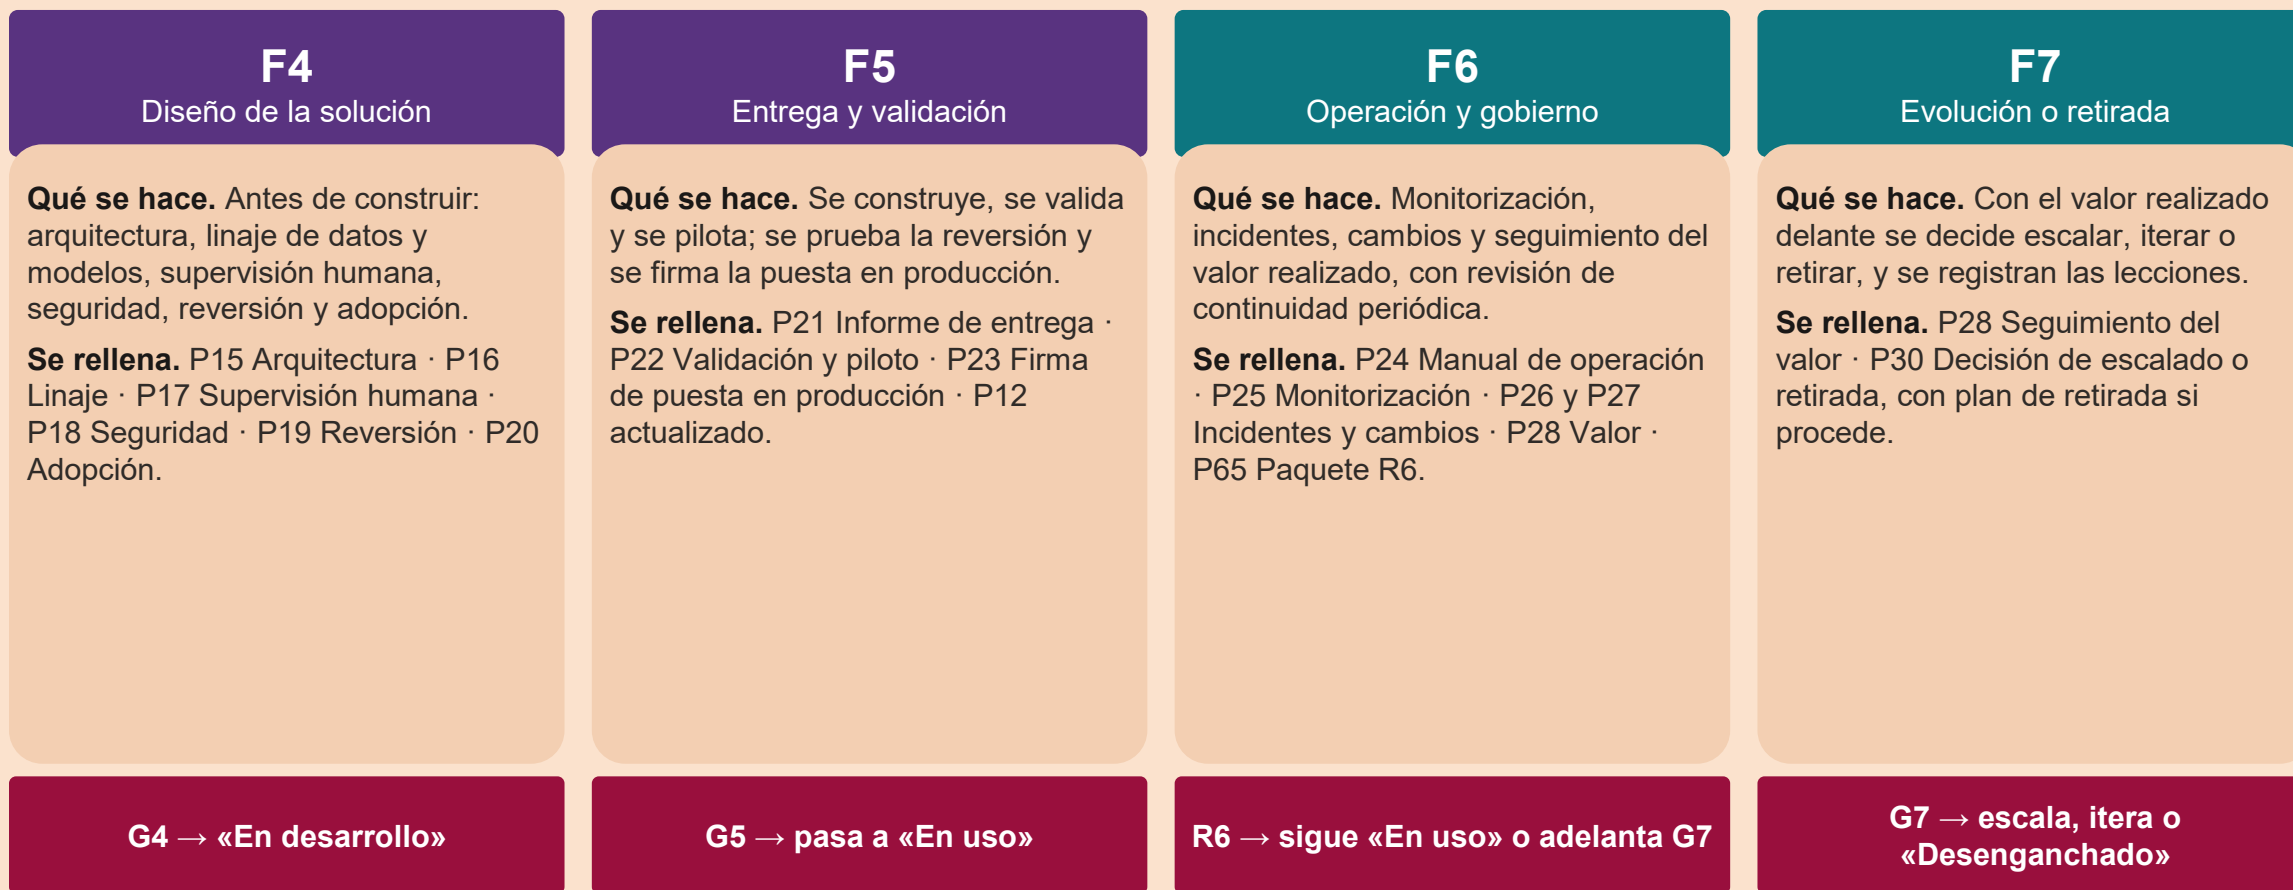

Cada decisión de puerta se deja en P29 y en el registro T01, con el estado de cada criterio y su evidencia.

El registro de iniciativas (T01): donde todo queda anotado


Cada iniciativa se da de alta como una oportunidad en un CRM; aquí, el registro de ejemplo con datos ficticios



- Una barra por fase: cuántas iniciativas hay ahora en cada una y cuánto valor esperado llevan.
- Al decidir una puerta, el registro guarda la fecha, el resultado, quién verificó y quién decidió, y el estado de cada criterio.
- Con esas fechas calcula solo el tiempo en fase y marca «estancadas» las que superan el plazo de referencia.
- Las cifras llevan estado: validado, declarado o estimado. Lo que no se sabe queda «sin dato», nunca cero.
- Alertas: puertas pendientes, condiciones vencidas, riesgos sin responsable.
- Todo se guarda en un fichero JSON de la propia compañía: sin servidor y sin enviar datos a nadie.

El embudo de la cartera: cómo se lee

La cartera de IA, leída como un embudo comercial. Datos ilustrativos

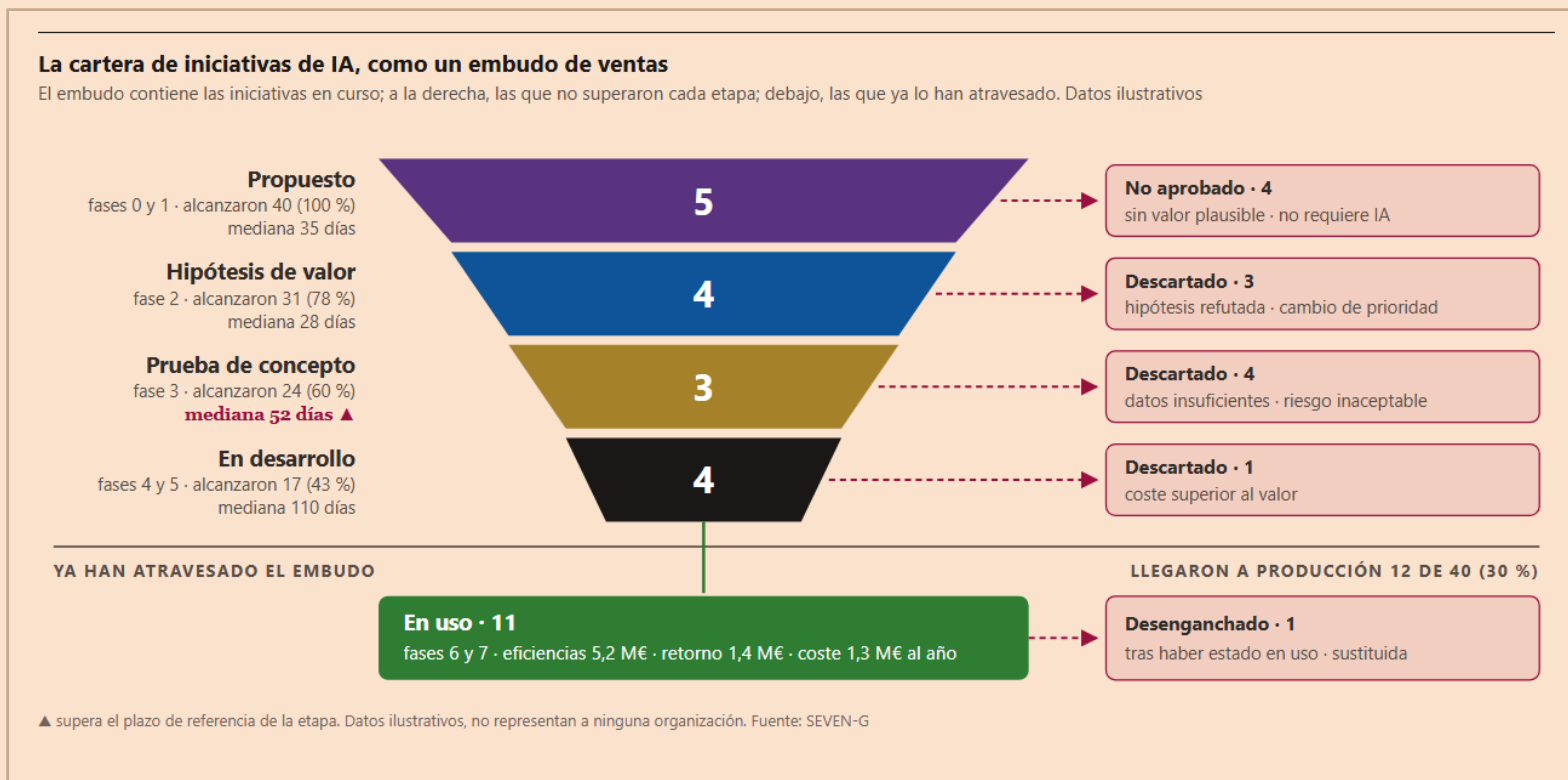

- Dentro del embudo, solo lo que está en curso: 5 propuestas, 4 con hipótesis de valor, 3 en prueba de concepto y 4 en desarrollo.
- A la izquierda, cuántas alcanzaron cada etapa (40 → 31 → 24 → 17) y cuánto tardan. El triángulo rojo avisa: la prueba de concepto supera su plazo.
- A la derecha, las que no superaron cada etapa y por qué: sin valor plausible, hipótesis refutada, riesgo inaceptable, coste superior al valor.
- Debajo, las que ya lo atravesaron: 11 en uso, con su valor y su coste, y 1 desenganchada.
- No se busca convertir más: parar en G3 una iniciativa inviable es un buen resultado. Un 100 % de conversión indicaría puertas blandas.

El panel del consejo (T17): cómo se lee

Se genera del mismo registro, sin volver a teclear nada. Datos ficticios

Riesgo y cumplimiento

Inventario

Glosario

que T01 no registra queda «sin dato», nunca a cero. La capacidad liberada que no se materializa en menor coste no suma en el neto. Las fotos de cada sesión se guardan en el histórico para comparar. Donde aparece *sin dato*, la compañía no ha reportado el campo. Las siglas se explican en el glosario.

Cartera y valor

Actual

Potencial

Comparar con: sin comparaci

Por compañía y unidad

Sin agrupar

Tarjetas

Tabla

Ordenar por neto anual

Q Buscar casos: nombre, unidad, tecnología, proveedor, riesgo...

15 de 15 casos Actual: valor declarado 2026 y costes estimados

Filtros Sin filtros: se muestran todos los casos. Pula «Filtros» para componer una consulta.

Limpiar filtros

Cartera y valor

Bloques 1 y 2 del panel trimestral · las tarjetas plegadas muestran su lectura en cabecera; haz clic para ver el detalle. Compromisos, decisiones GO/NO-GO y riesgos abiertos se siguen en el registro de recomendaciones, no aquí.

15

Casos seleccionados

En uso: 4 · En desarrollo: 3 · POC: 1 · Desenganchado: 1 · Propuesto: 3 · Hipótesis de valor: 2 · Descartado: 1

2,4 M€

Costes: coste anual

Inversión de construcción 6,5 M€ · 11 de 15 casos con coste estimado por el consejo asesor

Ver desglose >

7,3 M€

Retorno total

Eficiencias 5,9 M€ + retorno 1,4 M€ · capacidad liberada no materializada 1,1 M€ (no suma)

Ver desglose >

4,8 M€

Neto anual

Retorno total 7,3 M€ – costes 2,4 M€ · 1 caso en uso con neto negativo

Ver desglose >

36 %

Valor actual validado por Control de Gestión

Declarado por la compañía 3,3 M€ · estimado por el consejo asesor 1,4 M€ · validado 2,7 M€

● En amarillo · amarillo < 50 % · rojo < 20 %

13 de 15

Clasificados por la compañía (Reglamento de IA)

Con criterio jurídico; el resto solo tiene la estimación del consejo asesor

● En objetivo · amarillo < 80 % · rojo < 50 %

3 de 15

Casos con controles completos

RIA, FRIA, DPIA, Seguridad, MUC y riesgo de IA ofensiva hechos o no aplicables

● En rojo · amarillo < 80 % · rojo < 50 %

Tema salmón

A- TEXTO A+

Plegar / desplegar todo

Cargar JSON

< Plegar menú

- 15 casos: cuántos hay en uso, en desarrollo, en prueba de concepto, propuestos y fuera.
- Costes 2,4 M€ al año y retorno total 7,3 M€ (eficiencias más retorno): el neto anual es 4,8 M€.
- La tarjeta amarilla es la importante: solo el 36 % del valor está validado por control de gestión. El resto es declarado o estimado.
- La capacidad liberada que no se materializa aparece aparte y no suma.
- En rojo: solo 3 de 15 casos tienen todos los controles (evaluaciones de impacto, seguridad, manual de uso).
- Otras páginas: embudo y ciclo de vida, histórico y adopción, riesgo y cumplimiento, inventario.

Si una cifra del panel no gusta, no se retoca el panel: se corrige la evidencia en el registro y se vuelve a generar.

■ DOS EJEMPLOS

Una iniciativa que se para y otra que llega a producción

Datos ficticios, ilustrativos: no describen ninguna compañía real.

Ejemplo 1 · Cuando una iniciativa se para


Cribado de candidaturas en procesos de selección (RR. HH.)

- Fases 0 y 1: RR. HH. la patrocina (P01–P05). Al decidir sobre personas, la intensidad es Enterprise (P04). Entra en «Propuesto».
- Fase 2: la hipótesis (P08) promete un 40 % menos de tiempo de cribado frente a la línea base (P09). El piloto lo confirma: G2, Continuar.
- Fase 3: la clasificación regulatoria (P11) lo sitúa como sistema de alto riesgo. La prueba de sesgo detecta que penaliza a candidatos de más edad.
- Se itera dos veces ajustando variables: corregir el sesgo destruye la capacidad predictiva que justificaba el proyecto.
- G3: riesgo residual alto sin mitigación viable (P12, P13). El comité de IA decide Parar; queda en P29 con su motivo.
- En el embudo aparece a la derecha de «Prueba de concepto»: Descartado · riesgo inaceptable. Lección: probar el sesgo antes, en la fase 2.

PARADA EN G3 · SE EVITÓ CONSTRUIR Y OPERAR UN SISTEMA INVIABLE

La iniciativa 1, sobre el ciclo de vida

Llegó a la fase 3 y no superó la puerta G3

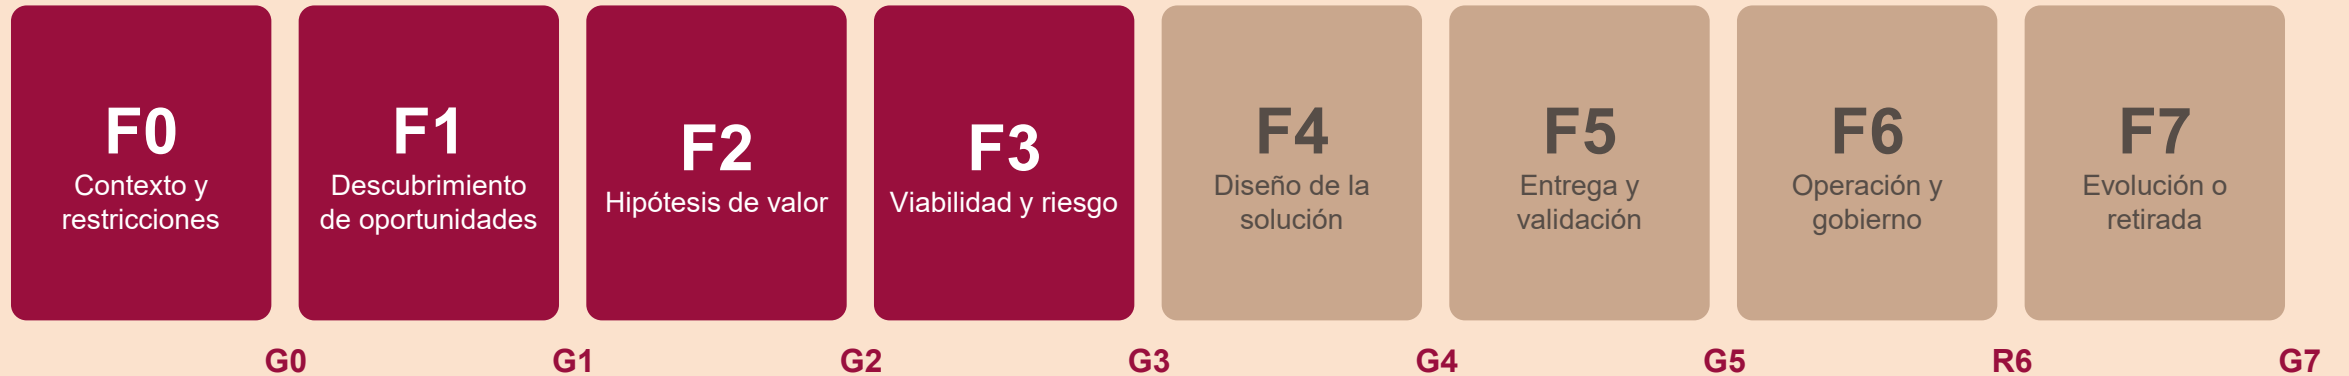

PARADA EN G3 · sale del embudo como «Descartado», con su motivo

Ejemplo 2 · Cuando una iniciativa llega a producción


Asistente de respuesta a incidencias de TI de primer nivel

- Fases 0 y 1: TI la patrocina; frente a la alternativa sin IA (más plantilla), se propone la esfera de operaciones con ambición Optimizar (P07).
- Fase 2: hipótesis de un 30 % menos de tiempo de resolución en incidencias sencillas; el piloto controlado da un 32 %.
- Fase 3: sin sesgo relevante, riesgo residual medio aceptado por su órgano (P12), proveedor evaluado (P14). G3, Continuar.
- Fases 4 y 5: supervisión humana obligatoria por encima de cierta gravedad (P17), reversión probada (P19) y firma de puesta en producción (P23).
- Fase 6: catorce meses en uso. Control de gestión valida 1,1 M€ al año (P28); la capacidad liberada se reasignó a incidencias complejas.
- En el embudo está en «En uso»; en el panel suma al neto anual porque su valor está validado, no declarado.

EN PRODUCCIÓN · 1,1 M€ DE RETORNO ANUAL VALIDADO · R6 TRIMESTRAL

La iniciativa 2, sobre el ciclo de vida

Recorrió las fases 0 a 6 y sigue en uso; la fase 7 llegará con G7

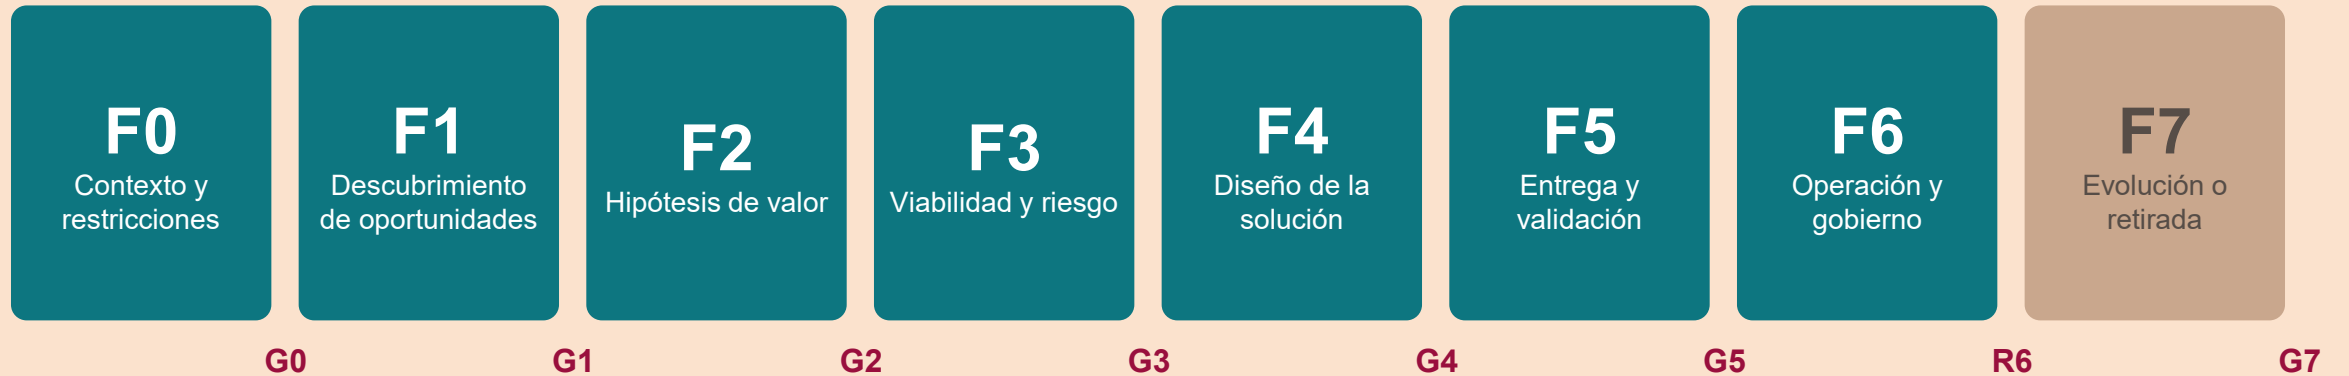

EN USO · cada R6 confirma que sigue aportando valor bajo control

Cómo se mide el valor

- Todo importe lleva fórmula y estado: validado (control de gestión), declarado (el equipo) o estimado.
- Las horas liberadas no son ahorro hasta que se materializan: baja un coste o se reasignan a una actividad con valor.
- El coste es completo: construcción, consumo, operación, supervisión humana y retirada.
- El índice de transformación usa ocho señales de evidencia para separar transformar de solo eficientar.
- Diez reglas de medición (documento 40). Ninguna cifra entra en el neto de la cartera sin su estado.

■ AUTOCONSULTORÍA

Implantarlo en su compañía, por sus propios medios

El marco está pensado para aplicarse sin contratar a nadie. Esto es lo que hace falta y en qué orden.

Antes de empezar: lo que la compañía necesita

- Mandato de implantación firmado por la primera línea ejecutiva, con objetivo, perímetro y plazo (P32).
- El consejo conoce el plan y reserva una sesión hacia la semana 12 para aprobar la dirección (C2).
- Un responsable de implantación con dedicación real y un equipo núcleo: negocio, tecnología, datos, riesgos, cumplimiento, seguridad, personas y control de gestión.
- Auditoría interna informada y asesoría jurídica disponible para la clasificación regulatoria.
- Un soporte de registro: T01, o una hoja de cálculo con los mismos campos.
- Sin moratoria: la actividad de IA sigue; solo se detiene lo que el diagnóstico señale como riesgo inaceptable.

Lite o Enterprise: proporcionalidad

- Dos decisiones distintas: el alcance de implantación es de la compañía; la intensidad, de cada iniciativa.
- El tamaño no decide. Basta un criterio Enterprise en una iniciativa: alto riesgo, decisiones sobre personas, exposición directa, agentes que actúan, datos protegidos, función crítica, Transformar o inversión alta.
- Ruta mínima Lite: consejo con punto de IA trimestral, comité de dirección mensual y oficina de IA de una persona a tiempo parcial.
- En Lite las puertas se agrupan (G0–G2 juntas, G4–G5 juntas, R6 semestral). G3 va siempre por separado.
- Ninguna evidencia obligatoria se omite en Lite: se simplifica. El inventario nunca se reduce.

El plan de 90 días

Tres meses, tres resultados y una decisión del consejo

Mes 1 · Diagnóstico (C1)

Mandato (P32). Inventario de toda la IA, también la de terceros y la no autorizada, con declaración de completitud. Madurez con evidencia (T15) e índice de transformación (T14). Hito 1: informe C1 verificado (P33).

Mes 2 · Riesgos y oportunidades

Talleres por esfera: riesgos de lo que ya existe (P11, P12) y oportunidades con valor estimado (P06, P07). Borrador de tesis de IA, ambición y apetito de riesgo (P35). Hito 2: propuesta de C2 lista para el consejo.

Mes 3 · Gobierno y cartera

Órganos y roles sin incompatibilidades (P38, P03), puertas y políticas, primer panel con datos reales (T17) y cartera priorizada (P36). El consejo aprueba C2 y el comité, C3. Hito 3: régimen ordinario.

Desde la semana 13, ninguna iniciativa nueva consume presupuesto sin pasar por G0.

Tres garantías que no se negocian, ni en pequeño

- Quien construye no verifica ni decide su propio trabajo.
- La conformidad de riesgos la emite alguien independiente del equipo.
- El consejo aprueba la dirección y el apetito de riesgo: no se delega.
- Una misma persona puede tener varios roles si no son incompatibles; el registro T01 lo comprueba (P03).
- Lo existente se regulariza con plazos aprobados, no se ignora: inventario primero, después riesgos y después puertas.

Errores frecuentes al implantarlo uno mismo

- Aplicar Enterprise a todo: el marco se vuelve pesado y se abandona. O no aplicar nada «porque somos pequeños».
- Rellenar las plantillas después de decidir: la documentación a posteriori invalida la puerta.
- Sumar horas liberadas como ahorro en el panel.
- No parar nunca nada: una cartera sin paradas no tiene puertas, tiene trámites.
- Un inventario incompleto: la IA de terceros y el uso no autorizado también cuentan.
- Dejar al consejo fuera hasta el final: su sesión se reserva el primer día.

Por dónde empezar mañana

- Una tarde: abra el registro de ejemplo (T01) y su panel (T17), y responda al diagnóstico de madurez (T15) con su situación real.
- Una semana: documentos 00, 01 y 90; decida alcance Lite o Enterprise y redacte el mandato (P32).
- La adopción puede ser modular: solo el registro, solo las puertas, solo la medición o solo el panel, y ampliar después.
- Si quiere acompañamiento, puede pedirlo a cualquier profesional; el documento 91 explica cómo evitar depender de él.
- Nada de esto exige registrarse ni contratar a nadie.

Gracias

SEVEN-G es gratuito: se usa, se descarga y se adapta sin registrarse, y el sitio nunca le escribirá. Si quiere hablar con el autor, la iniciativa es suya.

SEVEN-G es una marca registrada de Fernando García Varela · CC BY 4.0 (contenidos) · MIT (código)

<https://www.linkedin.com/in/fernandogarciavarela/>
