# SEVEN-G

**Empresa · Autoconsultoría**

Qué es SEVEN-G, cómo se llena el embudo de casos de uso hasta el panel del consejo y cómo implantarlo en su compañía por sus propios medios.

Fernando García Varela · Curso de autoaprendizaje · CC BY 4.0 · Ejemplos con datos ficticios

# El problema que resuelve

- Muchas compañías tienen pilotos de IA que funcionan, pero pocos llegan a producción.
- El valor se declara («liberamos 200 horas») y casi nadie lo comprueba.
- Nadie tiene autoridad clara para parar un caso de uso que no funciona.
- El consejo pregunta por la IA y recibe una lista de proyectos técnicos, no decisiones de negocio.
- ¿La compañía se está transformando con IA, o solo es un poco más eficiente? Casi nadie puede contestarlo con evidencia.

**No es un problema de tecnología: es un problema de gobierno y de medición.**

# Qué es SEVEN-G y qué aporta


- Seven-phase Enterprise Value & Governance: una fase 0 habilitante y siete fases de valor, con gobierno en todas.
- Ordena la IA como una cartera: cada caso de uso tiene fase, coste, valor esperado y responsable.
- Pone puertas de decisión entre las fases: sin evidencia verificada no se avanza.
- Separa quién decide, quién construye y quién controla, y traduce la regulación a fases, roles y evidencias.
- Mide el valor en dinero y con estado —validado, declarado o estimado— y se lo enseña al consejo en un panel.
- Es gratuito y modificable: documentos, plantillas en Word y herramientas, con licencia abierta.

# Dos niveles: la compañía y cada caso de uso

- C1 · Diagnóstico: inventario, madurez en siete dimensiones e índice de transformación.
- C2 · Dirección: el consejo aprueba la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo.
- C3 · Cartera: qué casos de uso se financian y en qué orden.
- C4 · Supervisión: panel del consejo y registro de decisiones y recomendaciones.
- C5 · Revisión anual: qué funcionó, qué no y qué cambia.
- Y, dentro de esa cartera, cada caso de uso recorre su propio ciclo de vida de ocho fases.

# El ciclo de vida de un caso de uso

Ocho fases con una puerta de decisión al final de cada una; debajo, la etapa del embudo en la que se ve cada fase

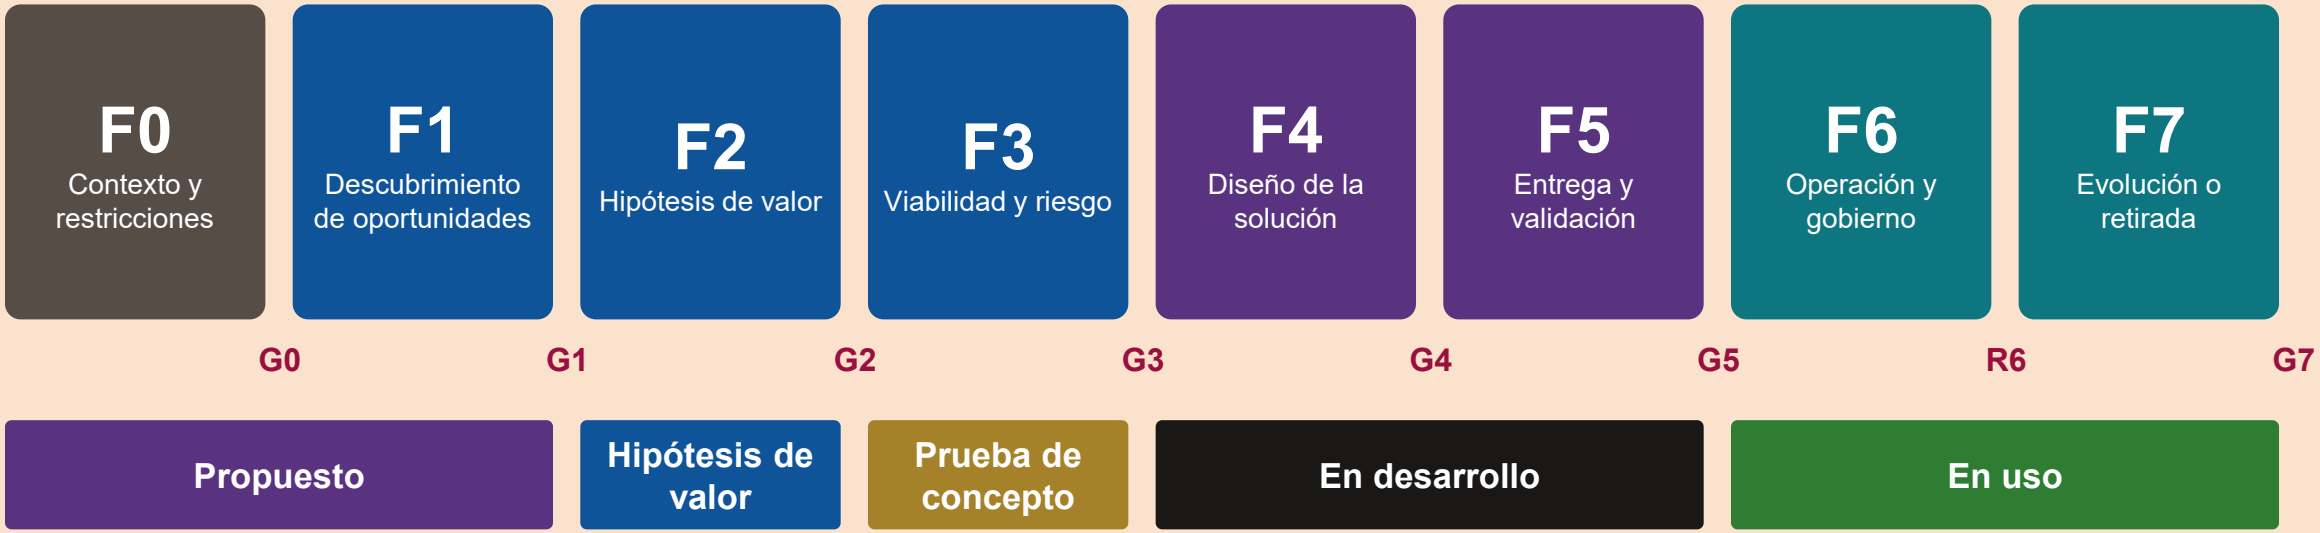

# Qué puede pasar en cada puerta

Cinco resultados; quien aporta la evidencia nunca es quien verifica ni quien decide

| Continuar | Con condiciones | Iterar | Pivotar | Parar |
|---|---|---|---|---|
| Se cumplen todos los criterios y las evidencias están verificadas: pasa a la fase siguiente. | Pasa, con plazo y responsable para lo pendiente. Nunca para controles críticos de seguridad, legales o de supervisión humana. | Se repite la fase con un ajuste concreto y se vuelve a la misma puerta. A la tercera, decide el órgano superior. | La hipótesis no se sostiene pero hay otra razonable: vuelve a la fase 2. Solo en G1, G2 y G3. | No hay valor plausible o el riesgo es inaceptable. Se registran el motivo y lo aprendido. Es un buen resultado. |

**En G7 los resultados son Escalar, Iterar o Retirar.**

DEL DOCUMENTO AL PANEL

# Cómo se llena el embudo

Nadie dibuja el embudo ni el panel: salen solos de lo que se rellena y se decide en cada fase. Este es el recorrido.

# Fases 0 a 3: de la idea a la prueba de concepto

Qué se hace, qué plantillas se rellenan y qué puerta cierra cada fase

## F0
Contexto y restricciones

**Qué se hace.** Se autoriza la idea: patrocinador, responsable, alcance, restricciones e intensidad (Lite o Enterprise).

**Se rellena.** P01 Carta del caso de uso · P02 Contexto y restricciones · P03 Roles · P04 Intensidad · P05 Alta en el inventario.

**G0 → entra en «Propuesto»**

## F1
Descubrimiento

**Qué se hace.** Se comparan oportunidades, también alternativas sin IA, y se propone esfera y nivel de ambición.

**Se rellena.** P06 Cartera de oportunidades y filtrado · P07 Esfera y ambición · P31 Ficha de caso de uso.

**G1 → sigue en «Propuesto»**

## F2
Hipótesis de valor

**Qué se hace.** Hipótesis falsable en dinero, con línea base, método de atribución y criterios de parada fijados antes de empezar.

**Se rellena.** P08 Lienzo de hipótesis de valor · P09 Línea base. Apoyo: calculadora T11.

**G2 → «Hipótesis de valor»**

## F3
Viabilidad y riesgo

**Qué se hace.** Prueba de concepto: viabilidad, clasificación regulatoria, riesgos y proveedores. Es la principal puerta de parada.

**Se rellena.** P10 Viabilidad · P11 Clasificación regulatoria e impacto · P12 Riesgos · P13 Mitigación · P14 Proveedor.

**G3 → «Prueba de concepto»**

**Cada decisión de puerta se deja en P29 y en el registro T01, con el estado de cada criterio y su evidencia.**

# Fases 4 a 7: del diseño a la producción y la retirada

La puesta en producción no cierra el ciclo: abre la operación, con revisiones periódicas

## F4
Diseño de la solución

**Qué se hace.** Antes de construir: arquitectura, linaje de datos y modelos, supervisión humana, seguridad, reversión y adopción.

**Se rellena.** P15 Arquitectura · P16 Linaje · P17 Supervisión humana · P18 Seguridad · P19 Reversión · P20 Adopción.

**G4 → «En desarrollo»**

## F5
Entrega y validación

**Qué se hace.** Se construye, se valida y se pilota; se prueba la reversión y se firma la puesta en producción.

**Se rellena.** P21 Informe de entrega · P22 Validación y piloto · P23 Firma de puesta en producción · P12 actualizado.

**G5 → pasa a «En uso»**

## F6
Operación y gobierno

**Qué se hace.** Monitorización, incidentes, cambios y seguimiento del valor realizado, con revisión de continuidad periódica.

**Se rellena.** P24 Manual de operación · P25 Monitorización · P26 y P27 Incidentes y cambios · P28 Valor · P65 Paquete R6.

**R6 → sigue «En uso» o adelanta G7**

## F7
Evolución o retirada

**Qué se hace.** Con el valor realizado delante se decide escalar, iterar o retirar, y se registran las lecciones.

**Se rellena.** P28 Seguimiento del valor · P30 Decisión de escalado o retirada, con plan de retirada si procede.

**G7 → escala, itera o «Desenganchado»**

**Cada decisión de puerta se deja en P29 y en el registro T01, con el estado de cada criterio y su evidencia.**

# El registro de casos de uso (T01): donde todo queda anotado


Cada caso de uso se da de alta como una oportunidad en un CRM; aquí, el registro de ejemplo con datos ficticios




- Una barra por fase: cuántos casos de uso hay ahora en cada una y cuánto valor esperado llevan.
- Al decidir una puerta, el registro guarda la fecha, el resultado, quién verificó y quién decidió, y el estado de cada criterio.
- Con esas fechas calcula solo el tiempo en fase y marca «estancadas» las que superan el plazo de referencia.
- Las cifras llevan estado: validado, declarado o estimado. Lo que no se sabe queda «sin dato», nunca cero.
- Alertas: puertas pendientes, condiciones vencidas, riesgos sin responsable.
- Todo se guarda en un fichero JSON de la propia compañía: sin servidor y sin enviar datos a nadie.

# El embudo de la cartera: cómo se lee


La cartera de IA, leída como un embudo comercial. Datos ilustrativos

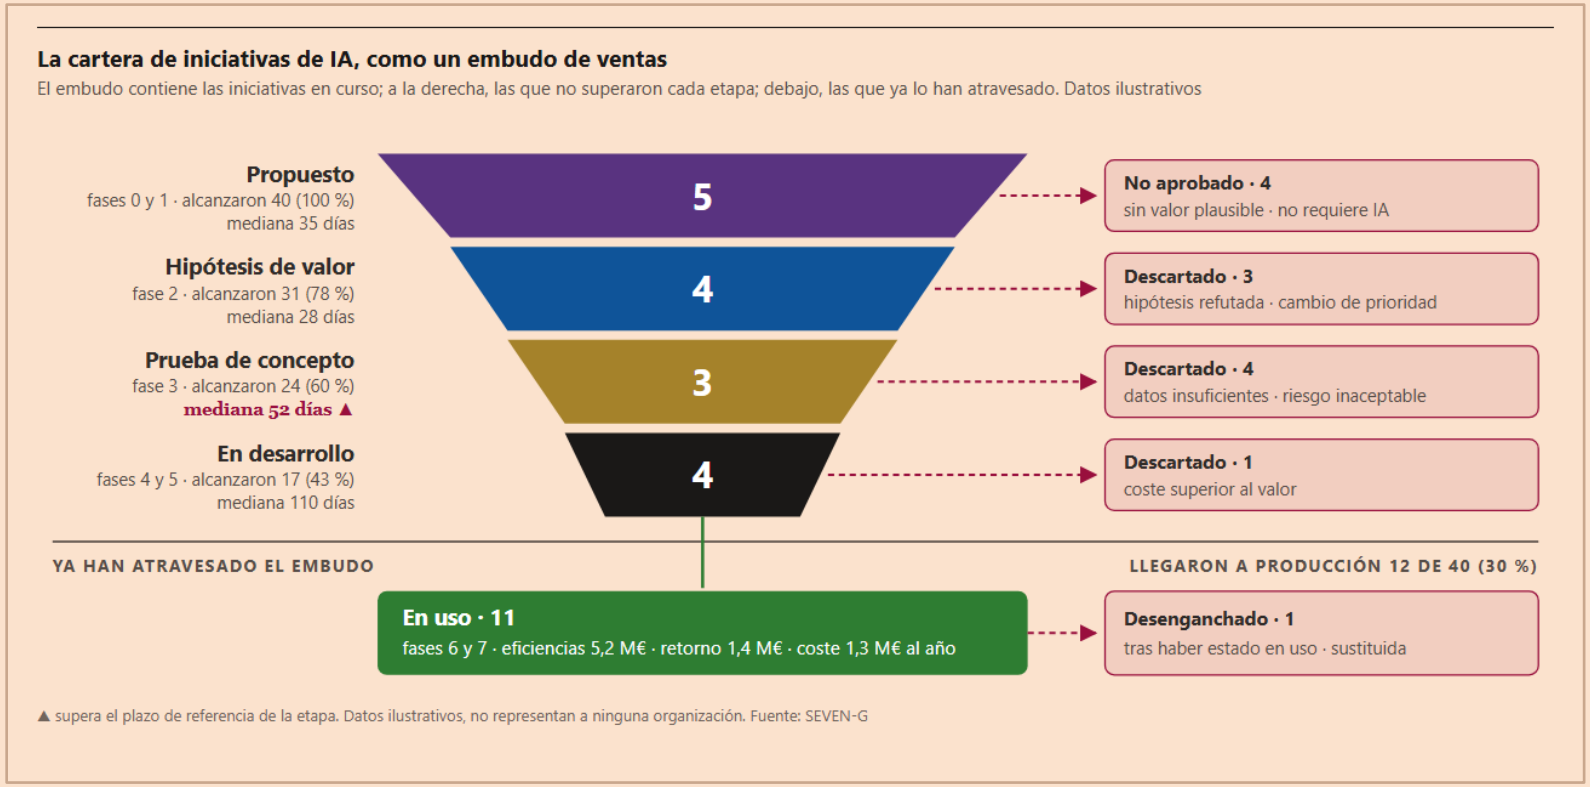


- Dentro del embudo, solo lo que está en curso: 5 propuestas, 4 con hipótesis de valor, 3 en prueba de concepto y 4 en desarrollo.
- A la izquierda, cuántas alcanzaron cada etapa (40 → 31 → 24 → 17) y cuánto tardan. El triángulo rojo avisa: la prueba de concepto supera su plazo.
- A la derecha, las que no superaron cada etapa y por qué: sin valor plausible, hipótesis refutada, riesgo inaceptable, coste superior al valor.
- Debajo, las que ya lo atravesaron: 11 en uso, con su valor y su coste, y 1 desenganchada.
- No se busca convertir más: parar en G3 un caso de uso inviable es un buen resultado. Un 100 % de conversión indicaría puertas blandas.

# El panel del consejo (T17): cómo se lee

Se genera del mismo registro, sin volver a teclear nada. Datos ficticios

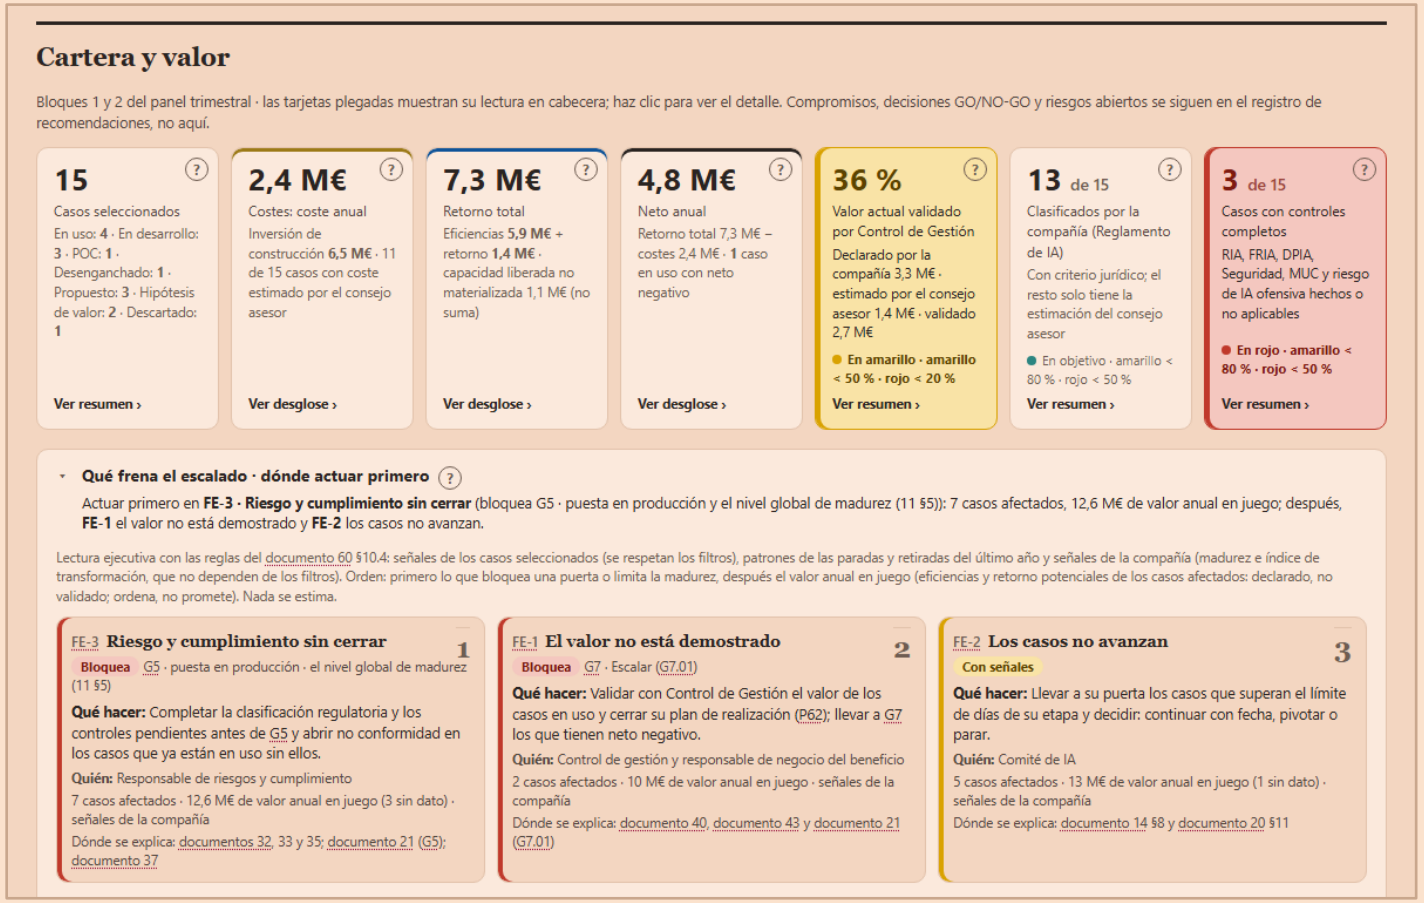



- Arriba, las cifras: 15 casos, costes 2,4 M€ al año, retorno total 7,3 M€ y neto anual 4,8 M€. Cada cifra se pulsa y abre sus casos.
- La tarjeta amarilla es la importante: solo el 36 % del valor está validado por control de gestión. En rojo: solo 3 de 15 casos tienen todos los controles.
- Debajo, «Qué frena el escalado»: los tres frenos por los que empezar, con qué bloquean, qué hacer, quién y el valor en juego (documento 60 §10.4).
- En el ejemplo: primero riesgo y cumplimiento (bloquea G5), después el valor sin validar (bloquea G7 · Escalar) y los casos que no avanzan.
- El valor en juego ordena, no promete: es declarado, no validado.

**Si una cifra del panel no gusta, no se retoca el panel: se corrige la evidencia en el registro y se vuelve a generar.**

# Dónde está el impacto: esferas × ambición

El mapa de calor de la cartera (T16) en el mismo panel. Datos ficticios

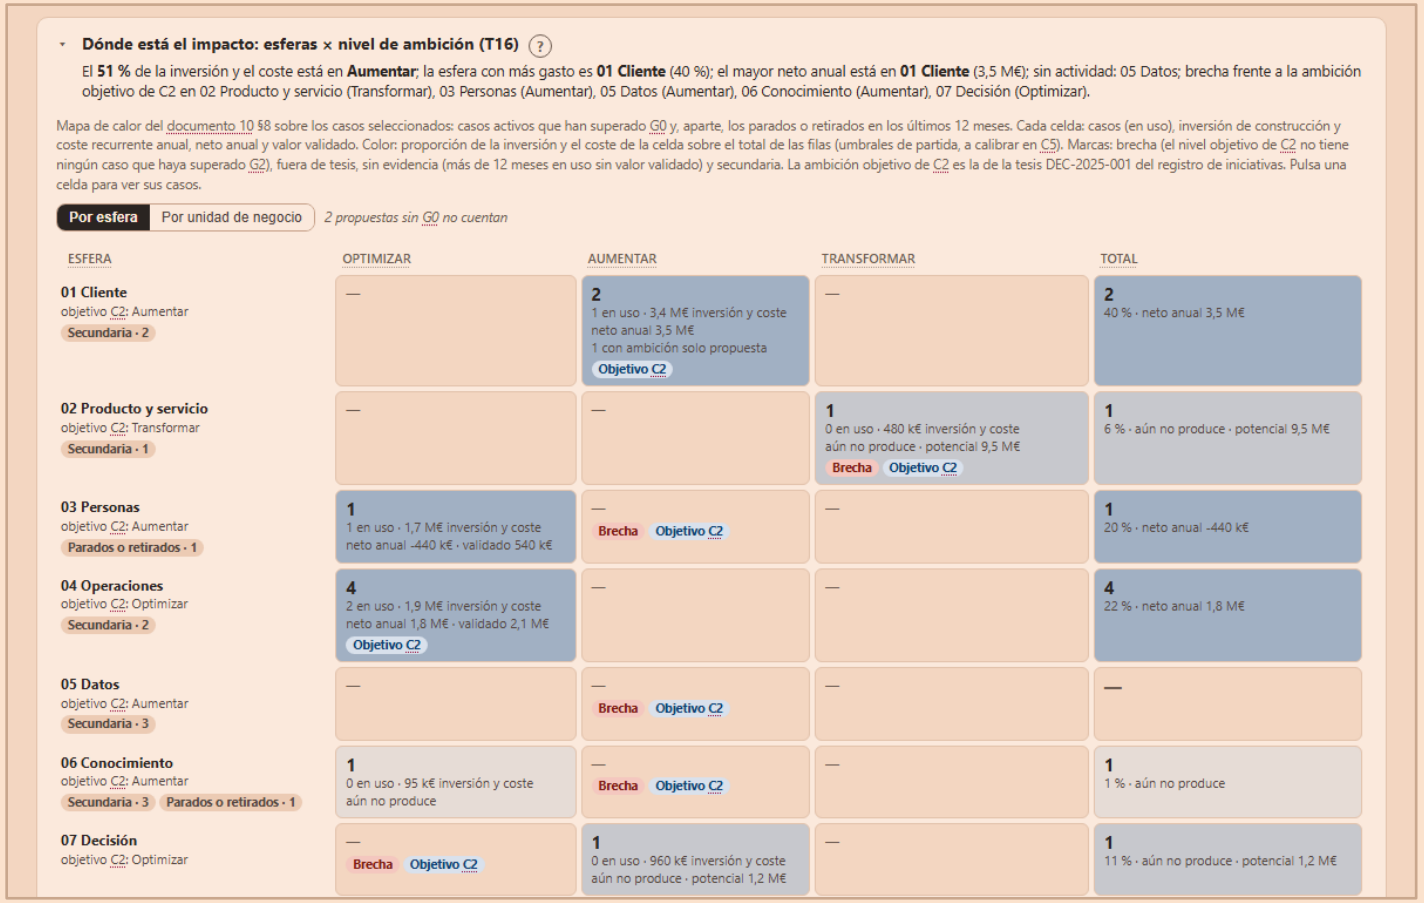

**Dónde está el impacto: esferas × nivel de ambición (T16)**

El **51 %** de la inversión y el coste está en **Aumentar**; la esfera con más gasto es **01 Cliente** (40 %); el mayor neto anual está en **01 Cliente** (3,5 M€); sin actividad: 05 Datos; brecha frente a la ambición objetivo de C2 en 02 Producto y servicio (Transformar), 03 Personas (Aumentar), 05 Datos (Aumentar), 06 Conocimiento (Aumentar), 07 Decisión (Optimizar).

Mapa de calor del documento 10 §8 sobre los casos seleccionados: casos activos que han superado G0 y, aparte, los parados o retirados en los últimos 12 meses. Cada celda: casos (en uso), inversión de construcción y coste recurrente anual, neto anual y valor validado. Color: proporción de la inversión y el coste de la celda sobre el total de las filas (umbrales de partida, a calibrar en C5). Marcas: brecha (el nivel objetivo de C2 no tiene ningún caso que haya superado G2), fuera de tesis, sin evidencia (más de 12 meses en uso sin valor validado) y secundaria. La ambición objetivo de C2 es la de la tesis DEC-2025-001 del registro de iniciativas. Pulsa una celda para ver sus casos.

Por esfera | Por unidad de negocio — *2 propuestas sin G0 no cuentan*

| ESFERA | OPTIMIZAR | AUMENTAR | TRANSFORMAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **01 Cliente**<br>objetivo C2: Aumentar<br>Secundaria · 2 | — | **2**<br>1 en uso · 3,4 M€ inversión y coste neto anual 3,5 M€<br>1 con ambición solo propuesta<br>Objetivo C2 | — | **2**<br>40 % · neto anual 3,5 M€ |
| **02 Producto y servicio**<br>objetivo C2: Transformar<br>Secundaria · 1 | — | — | **1**<br>0 en uso · 480 k€ inversión y coste aún no produce · potencial 9,5 M€<br>Brecha Objetivo C2 | **1**<br>6 % · aún no produce · potencial 9,5 M€ |
| **03 Personas**<br>objetivo C2: Aumentar<br>Parados o retirados · 1 | **1**<br>1 en uso · 1,7 M€ inversión y coste neto anual -440 k€ · validado 540 k€ | —<br>Brecha Objetivo C2 | — | **1**<br>20 % · neto anual -440 k€ |
| **04 Operaciones**<br>objetivo C2: Optimizar<br>Secundaria · 2 | **4**<br>2 en uso · 1,9 M€ inversión y coste neto anual 1,8 M€ · validado 2,1 M€<br>Objetivo C2 | — | — | **4**<br>22 % · neto anual 1,8 M€ |
| **05 Datos**<br>objetivo C2: Aumentar<br>Secundaria · 3 | — | —<br>Brecha Objetivo C2 | — | — |
| **06 Conocimiento**<br>objetivo C2: Aumentar<br>Secundaria · 3 Parados o retirados · 1 | **1**<br>0 en uso · 95 k€ inversión y coste aún no produce | —<br>Brecha Objetivo C2 | — | **1**<br>1 % · aún no produce |
| **07 Decisión**<br>objetivo C2: Optimizar | —<br>Brecha Objetivo C2 | **1**<br>0 en uso · 960 k€ inversión y coste aún no produce · potencial 1,2 M€ | — | **1**<br>11 % · aún no produce · potencial 1,2 M€ |

- Filas: las áreas donde la IA crea valor (cliente, producto, personas, operaciones, datos, conocimiento, decisión). Columnas: optimizar, aumentar, transformar.
- Cada celda: casos, inversión y coste, neto anual y valor validado; el color dice dónde se concentra el gasto.
- «Brecha»: la ambición que aprobó la dirección en C2 para esa esfera no tiene ningún caso que haya superado G2.
- En el ejemplo: el 40 % del gasto está en Cliente, Datos no tiene actividad y cinco esferas tienen brecha.
- La ambición objetivo sale de la tesis aprobada en el registro, no se escribe en el panel.

**La pregunta que responde: ¿dónde tiene la IA más impacto en la compañía y dónde no estamos jugando? (documento 10 §8)**

DOS EJEMPLOS

# Un caso de uso que se para y otro que llega a producción

Datos ficticios, ilustrativos: no describen ninguna compañía real.

# Ejemplo 1 · Cuando un caso de uso se para


## Cribado de candidaturas en procesos de selección (RR. HH.)

- Fases 0 y 1: RR. HH. la patrocina (P01–P05). Al decidir sobre personas, la intensidad es Enterprise (P04). Entra en «Propuesto».
- Fase 2: la hipótesis (P08) promete un 40 % menos de tiempo de cribado frente a la línea base (P09). El piloto lo confirma: G2, Continuar.
- Fase 3: la clasificación regulatoria (P11) lo sitúa como sistema de alto riesgo. La prueba de sesgo detecta que penaliza a candidatos de más edad.
- Se itera dos veces ajustando variables: corregir el sesgo destruye la capacidad predictiva que justificaba el proyecto.
- G3: riesgo residual alto sin mitigación viable (P12, P13). El comité de IA decide Parar; queda en P29 con su motivo.
- En el embudo aparece a la derecha de «Prueba de concepto»: Descartado · riesgo inaceptable. Lección: probar el sesgo antes, en la fase 2.

**PARADA EN G3 · SE EVITÓ CONSTRUIR Y OPERAR UN SISTEMA INVIABLE**

# El caso de uso 1, sobre el ciclo de vida

Llegó a la fase 3 y no superó la puerta G3

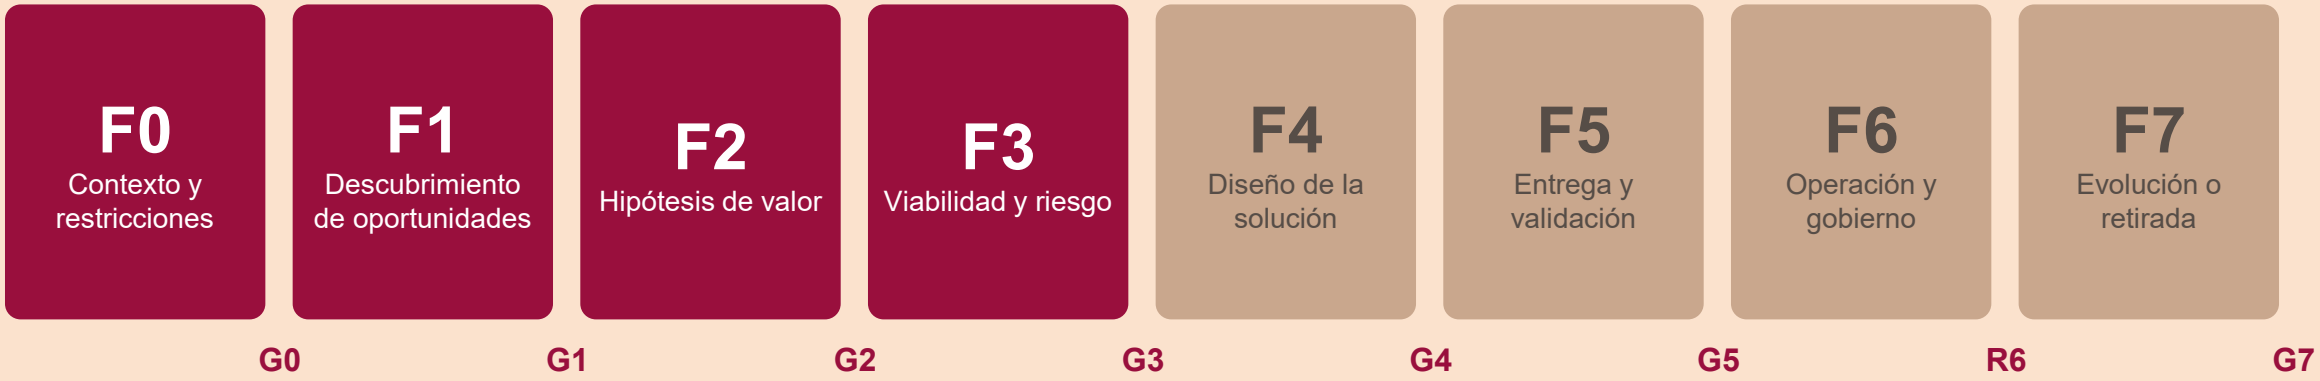


**PARADA EN G3 · sale del embudo como «Descartado», con su motivo**

# Ejemplo 2 · Cuando un caso de uso llega a producción


## Asistente de respuesta a incidencias de TI de primer nivel

- Fases 0 y 1: TI la patrocina; frente a la alternativa sin IA (más plantilla), se propone la esfera de operaciones con ambición Optimizar (P07).
- Fase 2: hipótesis de un 30 % menos de tiempo de resolución en incidencias sencillas; el piloto controlado da un 32 %.
- Fase 3: sin sesgo relevante, riesgo residual medio aceptado por su órgano (P12), proveedor evaluado (P14). G3, Continuar.
- Fases 4 y 5: supervisión humana obligatoria por encima de cierta gravedad (P17), reversión probada (P19) y firma de puesta en producción (P23).
- Fase 6: catorce meses en uso. Control de gestión valida 1,1 M€ al año (P28); la capacidad liberada se reasignó a incidencias complejas.
- En el embudo está en «En uso»; en el panel suma al neto anual porque su valor está validado, no declarado.

**EN PRODUCCIÓN · 1,1 M€ DE RETORNO ANUAL VALIDADO · R6 TRIMESTRAL**

# El caso de uso 2, sobre el ciclo de vida

Recorrió las fases 0 a 6 y sigue en uso; la fase 7 llegará con G7

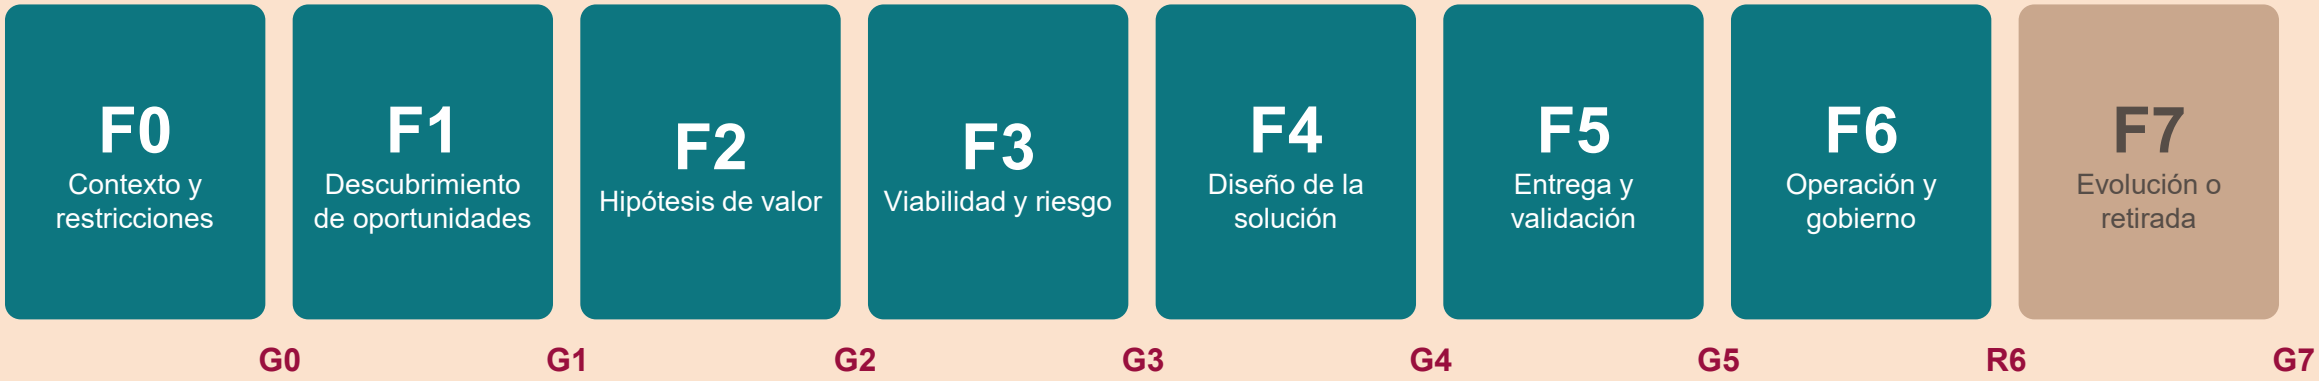


**EN USO · cada R6 confirma que sigue aportando valor bajo control**

# Cómo se mide el valor

- Todo importe lleva fórmula y estado: validado (control de gestión), declarado (el equipo) o estimado.
- Las horas liberadas no son ahorro hasta que se materializan: baja un coste o se reasignan a una actividad con valor.
- El coste es completo: construcción, consumo, operación, supervisión humana y retirada.
- El índice de transformación usa ocho señales de evidencia para separar transformar de solo eficientar.
- Diez reglas de medición (documento 40). Ninguna cifra entra en el neto de la cartera sin su estado.

AUTOCONSULTORÍA

# Implantarlo en su compañía, por sus propios medios

El marco está pensado para aplicarse sin contratar a nadie. Esto es lo que hace falta y en qué orden.

# Antes de empezar: lo que la compañía necesita

- Mandato de implantación firmado por la primera línea ejecutiva, con objetivo, perímetro y plazo (P32).
- El consejo conoce el plan y reserva una sesión hacia la semana 12 para aprobar la dirección (C2).
- Un responsable de implantación con dedicación real y un equipo núcleo: negocio, tecnología, datos, riesgos, cumplimiento, seguridad, personas y control de gestión.
- Auditoría interna informada y asesoría jurídica disponible para la clasificación regulatoria.
- Un soporte de registro: T01, o una hoja de cálculo con los mismos campos.
- Sin moratoria: la actividad de IA sigue; solo se detiene lo que el diagnóstico señale como riesgo inaceptable.

# Lite o Enterprise: proporcionalidad

- Dos decisiones distintas: el alcance de implantación es de la compañía; la intensidad, de cada caso de uso.
- El tamaño no decide. Basta un criterio Enterprise en un caso de uso: alto riesgo, decisiones sobre personas, exposición directa, agentes que actúan, datos protegidos, función crítica, Transformar o inversión alta.
- Ruta mínima Lite: consejo con punto de IA trimestral, comité de dirección mensual y oficina de IA de una persona a tiempo parcial.
- En Lite las puertas se agrupan (G0–G2 juntas, G4–G5 juntas, R6 semestral). G3 va siempre por separado.
- Ninguna evidencia obligatoria se omite en Lite: se simplifica. El inventario nunca se reduce.

**Documento 90, sección 2.4, y matriz de obligatoriedad (documento 94).**

# El plan de 90 días

Tres meses, tres resultados y una decisión del consejo

## Mes 1 · Diagnóstico (C1)

Mandato (P32). Inventario de toda la IA, también la de terceros y la no autorizada, con declaración de completitud. Madurez con evidencia (T15) e índice de transformación (T14). Hito 1: informe C1 verificado (P33).

## Mes 2 · Riesgos y oportunidades

Talleres por esfera: riesgos de lo que ya existe (P11, P12) y oportunidades con valor estimado (P06, P07). Borrador de tesis de IA, ambición y apetito de riesgo (P35). Hito 2: propuesta de C2 lista para el consejo.

## Mes 3 · Gobierno y cartera

Órganos y roles sin incompatibilidades (P38, P03), puertas y políticas, primer panel con datos reales (T17) y cartera priorizada (P36). El consejo aprueba C2 y el comité, C3. Hito 3: régimen ordinario.

**Desde la semana 13, ningún caso de uso nuevo consume presupuesto sin pasar por G0.**

# Tres garantías que no se negocian, ni en pequeño

- Quien construye no verifica ni decide su propio trabajo.
- La conformidad de riesgos la emite alguien independiente del equipo.
- El consejo aprueba la dirección y el apetito de riesgo: no se delega.
- Una misma persona puede tener varios roles si no son incompatibles; el registro T01 lo comprueba (P03).
- Lo existente se regulariza con plazos aprobados, no se ignora: inventario primero, después riesgos y después puertas.

# Errores frecuentes al implantarlo uno mismo

- Aplicar Enterprise a todo: el marco se vuelve pesado y se abandona. O no aplicar nada «porque somos pequeños».
- Rellenar las plantillas después de decidir: la documentación a posteriori invalida la puerta.
- Sumar horas liberadas como ahorro en el panel.
- No parar nunca nada: una cartera sin paradas no tiene puertas, tiene trámites.
- Un inventario incompleto: la IA de terceros y el uso no autorizado también cuentan.
- Dejar al consejo fuera hasta el final: su sesión se reserva el primer día.

# Por dónde empezar mañana

- Una tarde: abra el registro de ejemplo (T01) y su panel (T17), y responda al diagnóstico de madurez (T15) con su situación real.
- Una semana: documentos 00, 01 y 90; decida alcance Lite o Enterprise y redacte el mandato (P32).
- La adopción puede ser modular: solo el registro, solo las puertas, solo la medición o solo el panel, y ampliar después.
- Si quiere acompañamiento, puede pedirlo a cualquier profesional; el documento 91 explica cómo evitar depender de él.
- Nada de esto exige registrarse ni contratar a nadie.

# Gracias

SEVEN-G es gratuito: se usa, se descarga y se adapta sin registrarse, y el sitio nunca le escribirá. Si quiere hablar con el autor, el primer paso es suyo.

SEVEN-G es un nombre y una marca de Fernando García Varela · CC BY 4.0 (contenidos) · MIT (código)

https://www.linkedin.com/in/fernandogarciavarela/

Aviso legal: ayuda metodológica genérica y gratuita, «tal cual» y con fines informativos; no es asesoramiento jurídico ni está revisada jurídicamente para ningún caso. Cada organización la adapta y es responsable de su revisión legal y de su cumplimiento regulatorio; puede no recoger cambios normativos recientes. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación. No otorga certificación de ningún tipo. Detalle en el documento 93.
