Gobernanza de IA orientada al valor

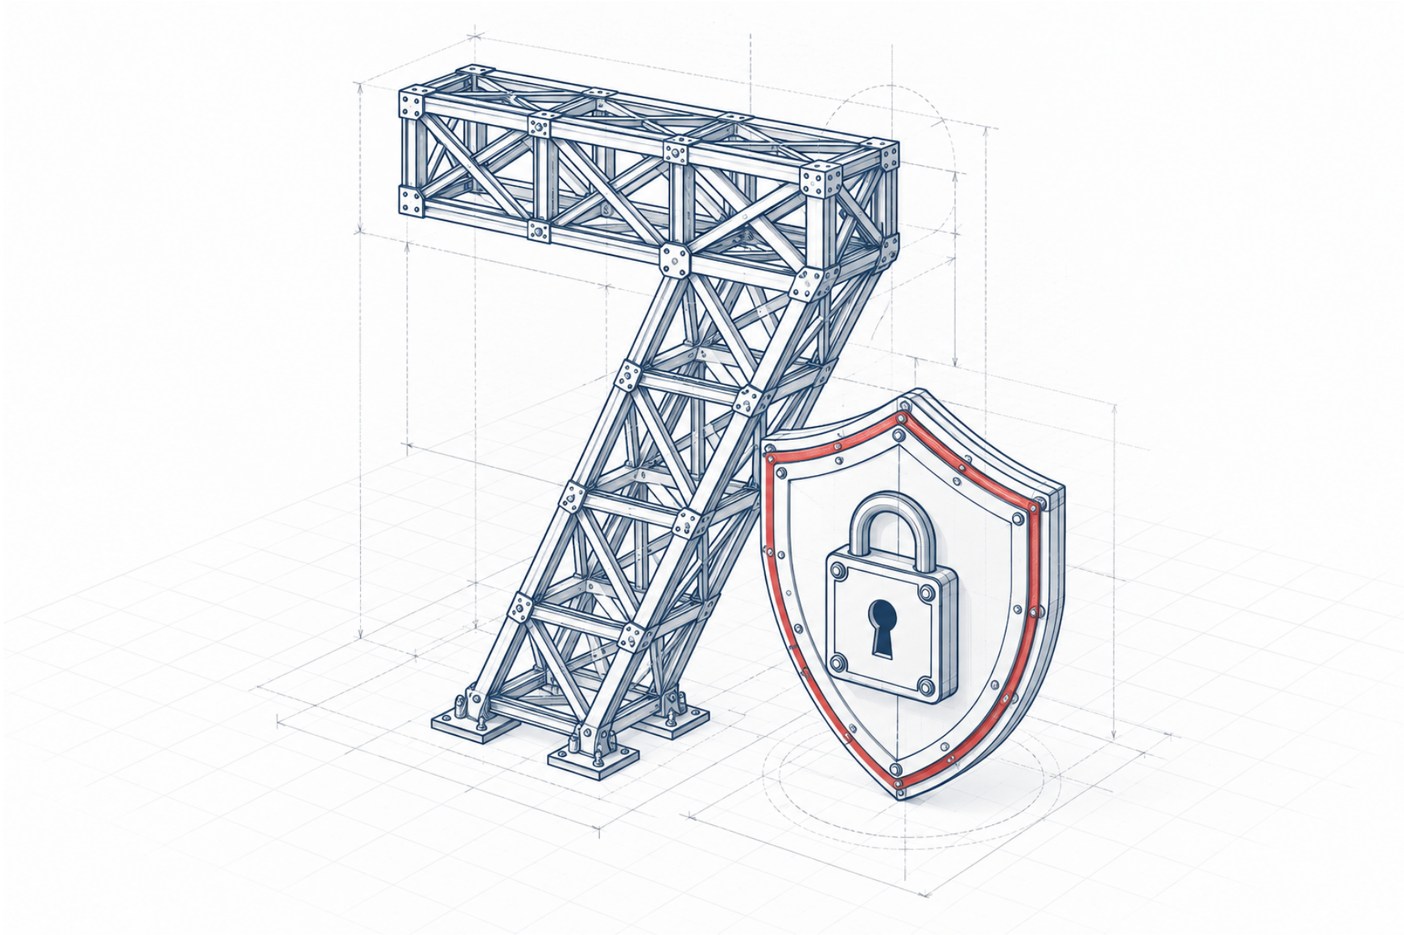

Convierte la inteligencia artificial en valor empresarial con una gobernanza disciplinada, trazable y auditable.

SEVEN-G organiza las decisiones, los controles y las evidencias a lo largo del ciclo de vida de una iniciativa de IA. El objetivo es conectar la inversión tecnológica con resultados de negocio verificables.

De la responsabilidad fragmentada a una dirección común

La IA necesita responsables claros y criterios compartidos para avanzar.

La propiedad fragmentada dificulta conectar decisiones, riesgos y resultados. SEVEN-G propone una estructura de gobernanza que haga explícita la responsabilidad sobre cada iniciativa.

Cuatro principios para generar valor sostenible

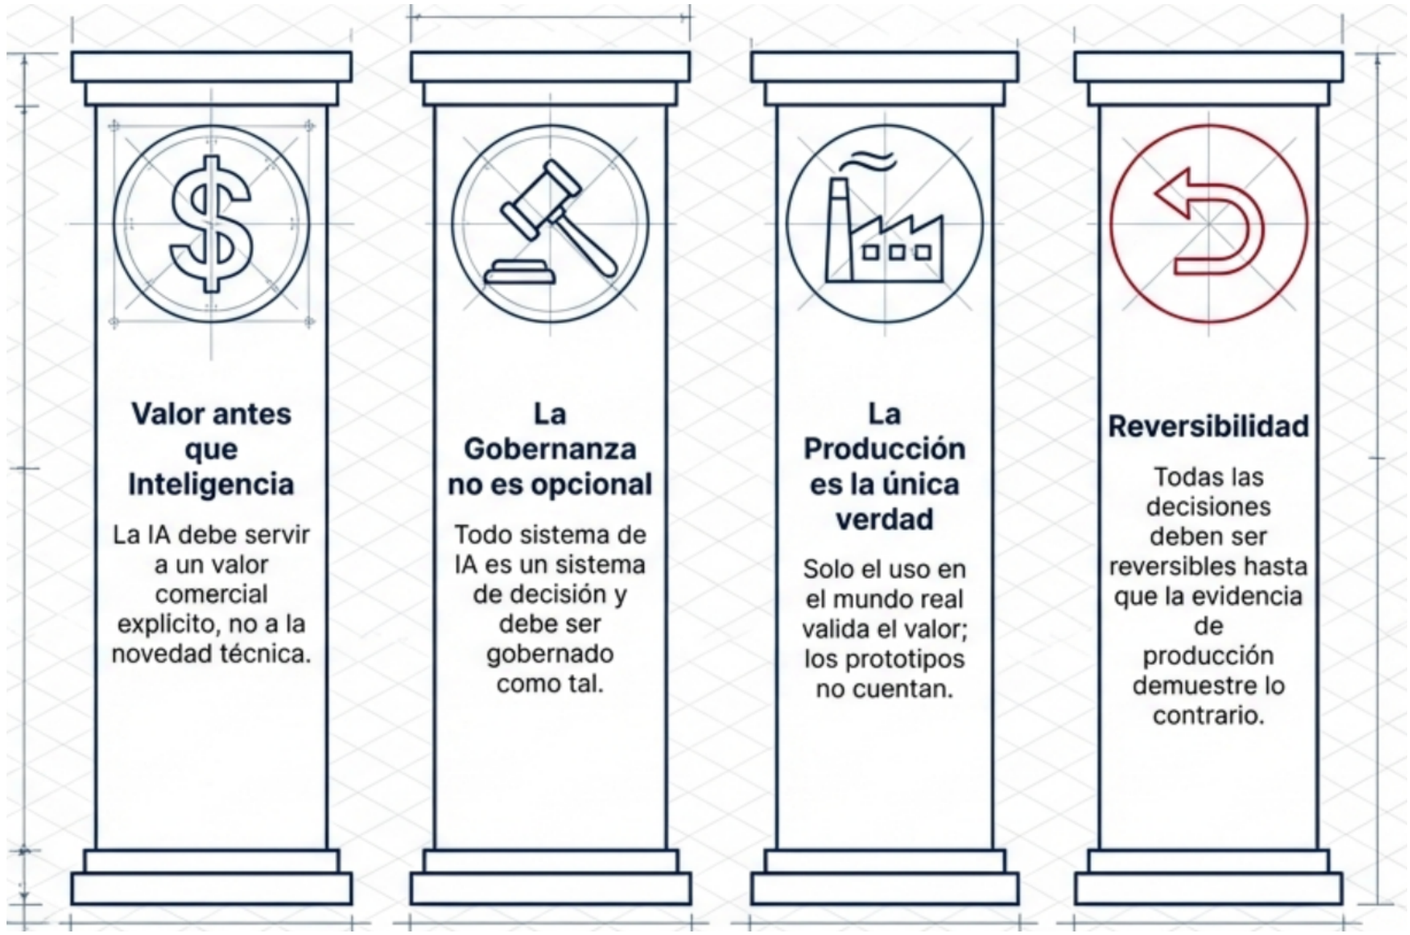

Valor de negocio, gobernanza, evidencia en producción y reversibilidad.

La iniciativa debe responder a un objetivo comercial explícito; sus decisiones deben estar gobernadas; su valor debe contrastarse en el uso real; y debe conservar opciones de reversión mientras la evidencia no justifique consolidar la decisión.

Un ciclo de vida con decisiones explícitas

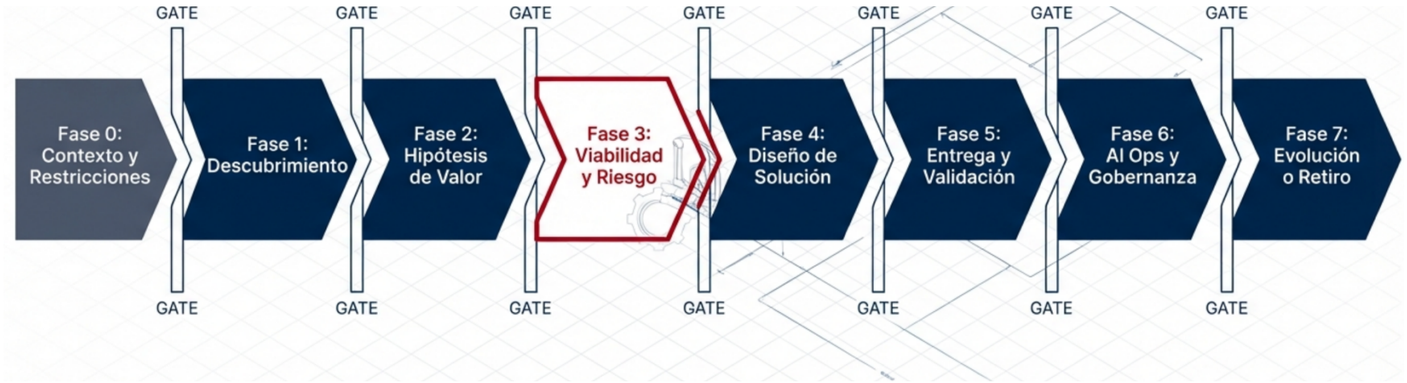

Una fase inicial de contexto y siete fases para descubrir, validar, operar y evolucionar.

El recorrido comprende contexto y restricciones (0), descubrimiento (1), hipótesis de valor (2), viabilidad y riesgo (3), diseño de solución (4), entrega y validación (5), AI Ops y gobernanza (6), y evolución o retiro (7). Las compuertas permiten validar, iterar, pivotar o detener.

Define los límites antes de invertir

Fase 0: Definición de Contexto y Restricciones

Estableciendo los límites antes de la inversión.

Sin esta fase, la iniciativa se considera no autorizada. Define las fronteras regulatorias, éticas y organizativas.

Controles Obligatorios

- ☐ Charter de Iniciativa de IA
  Define el objetivo estratégico explícito.
- ☐ Declaración de Contexto y Restricciones
  Límites éticos y presupuestarios aprobados.
- ☐ Registro de Asignación de Roles
  Designación formal de quién es responsable (Accountability).

Objetivo: Asegurar la alineación estratégica y evitar riesgos sistémicos desde el inicio.

Aclara el propósito, las restricciones y los responsables desde el inicio.

La fase 0 establece las fronteras regulatorias, éticas y organizativas de la iniciativa. Sus evidencias incluyen el charter, la declaración de contexto y restricciones y el registro de asignación de roles. Dentro del marco SEVEN-G, esta definición precede a la autorización de la iniciativa.

De la oportunidad a una hipótesis comprobable

Prioriza oportunidades de negocio y formula hipótesis de valor medibles.

El descubrimiento reúne oportunidades y las somete a un filtro de negocio. La hipótesis de valor concreta qué resultado se espera y cómo se contrastará. Debe poder refutarse: una hipótesis que no puede fallar no permite aprender de la evidencia.

Decide si la iniciativa debe continuar

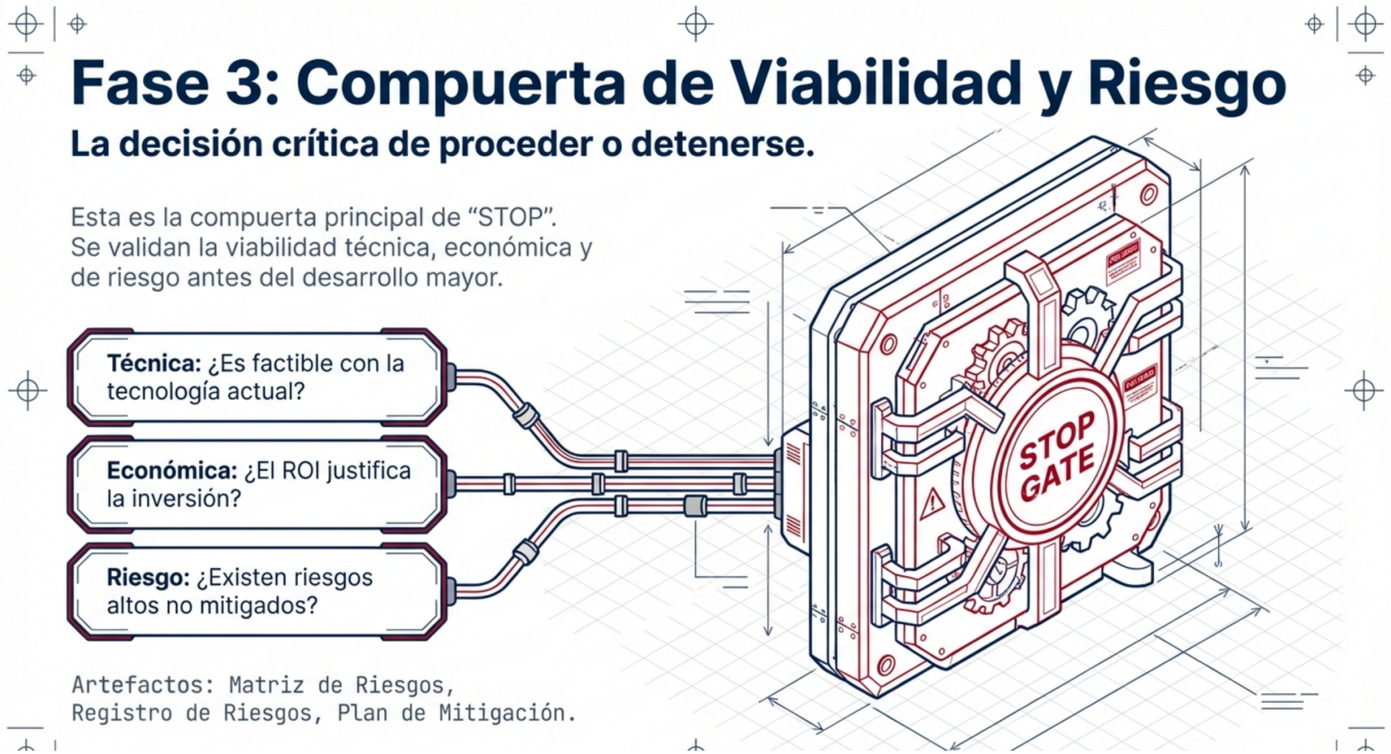

Valida la viabilidad técnica, económica y de riesgo antes del desarrollo mayor.

La fase 3 es la compuerta crítica para proceder o detenerse. Contrasta la factibilidad técnica, la justificación de la inversión y la existencia de riesgos altos no mitigados. La decisión se apoya en una matriz de riesgos, un registro y un plan de mitigación.

Diseña para poder auditar

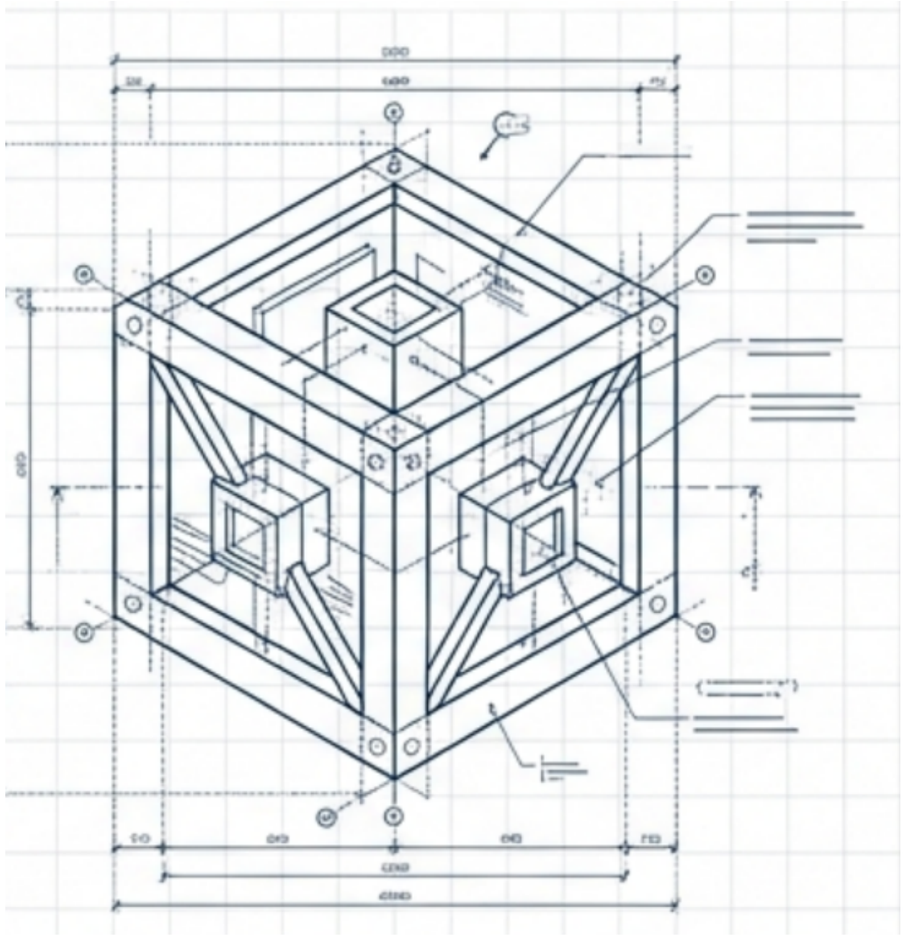

Integra trazabilidad, linaje y capacidad de reversión en la arquitectura.

En la fase 4 se diseña la solución junto con su gobernanza. El linaje de datos y modelos permite reconstruir el recorrido desde el origen hasta la decisión. La capacidad de rollback forma parte del diseño.

Valida con evidencia de producción

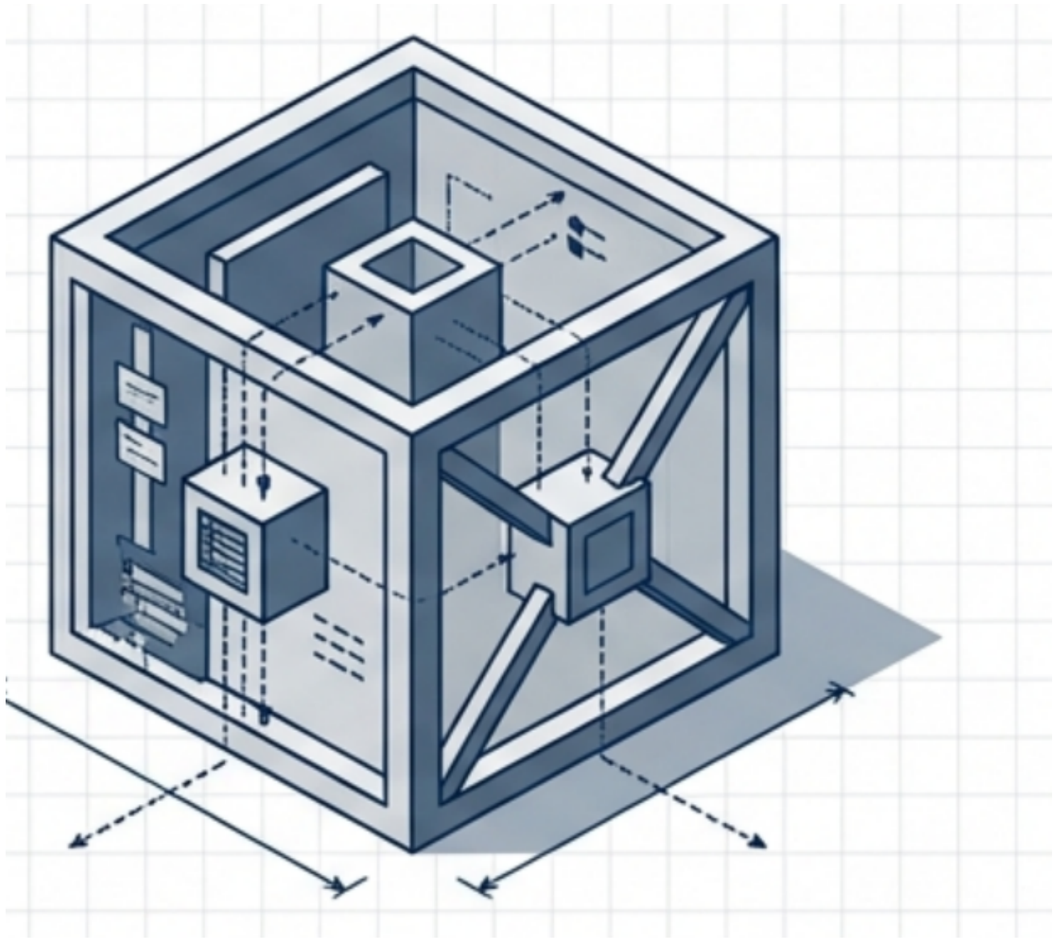

Demuestra el funcionamiento de la solución en su entorno real.

La fase 5 conecta la entrega con la validación en producción. Los resultados teóricos se complementan con evidencia de uso real, recogida en el informe de entrega y los resultados de validación.

Opera, aprende y decide cómo evolucionar

Supervisa la estabilidad y el valor para escalar, iterar o retirar.

La fase 6 mantiene la operación y vigila el deterioro del modelo. La fase 7 utiliza la evidencia y el seguimiento del valor realizado para decidir el siguiente paso. El ciclo conecta operación, aprendizaje y evolución.

Resultados y evidencias: una validación dual



Una fase se completa cuando alcanza sus objetivos y aporta documentación auditable.

El mecanismo stage-gate exige resultados tangibles y artefactos de soporte. El marco excluye las autoaprobaciones: la falta de evidencia impide avanzar y el cumplimiento parcial conduce a iterar, no a una aprobación incondicional.

Separa la ejecución del control

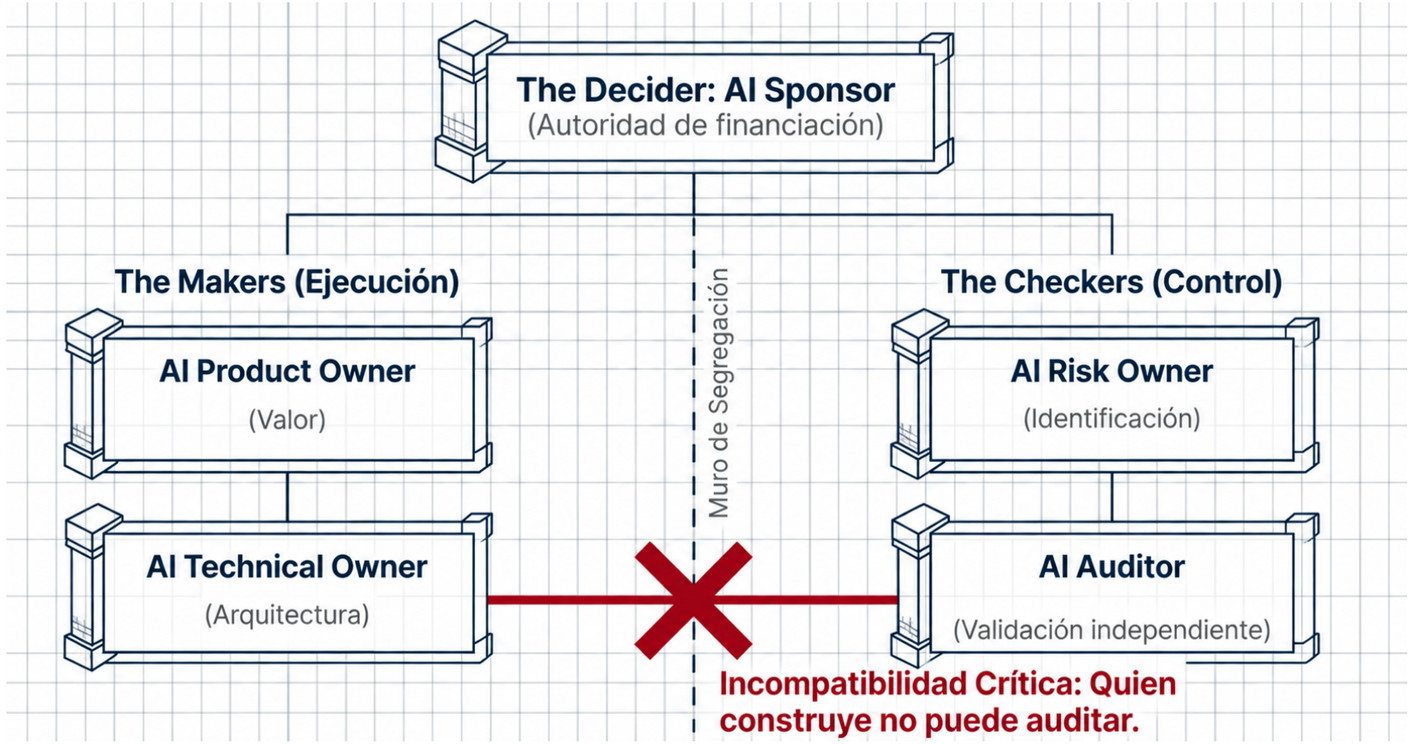

Define quién financia, quién construye y quién valida de forma independiente.

El AI Sponsor ejerce la autoridad de financiación. AI Product Owner y AI Technical Owner lideran valor y arquitectura; AI Risk Owner y AI Auditor ejercen funciones de control. La incompatibilidad central del marco es que quien construye no puede auditar su propio trabajo.

Observa el riesgo en todas sus dimensiones

Evalúa de forma continua los riesgos que pueden comprometer el valor de la IA.

El mapa de riesgos considera dimensiones estratégicas, técnicas, de datos, económicas, legales, organizativas y reputacionales. El radar es una ilustración conceptual del documento, no una medición de una organización concreta.

Cierra el ciclo de corrección

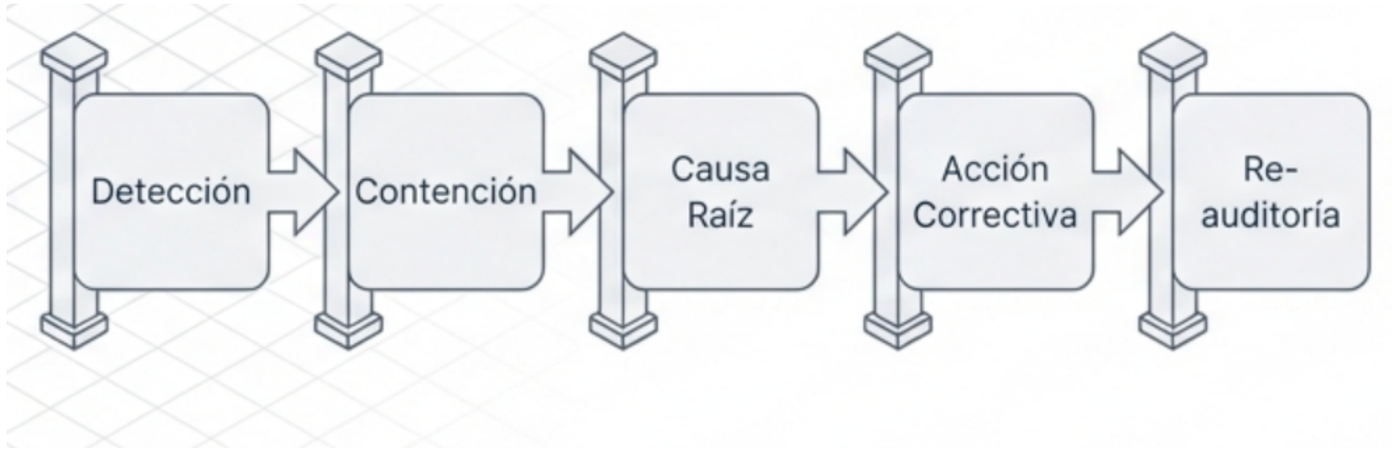

Detecta, contiene, identifica la causa, corrige y vuelve a auditar.

La gestión de no conformidades conecta la detección con acciones correctivas verificables. La reauditoría comprueba el resultado de la corrección y aporta evidencia para actualizar los controles.

Conecta la gobernanza con los requisitos aplicables

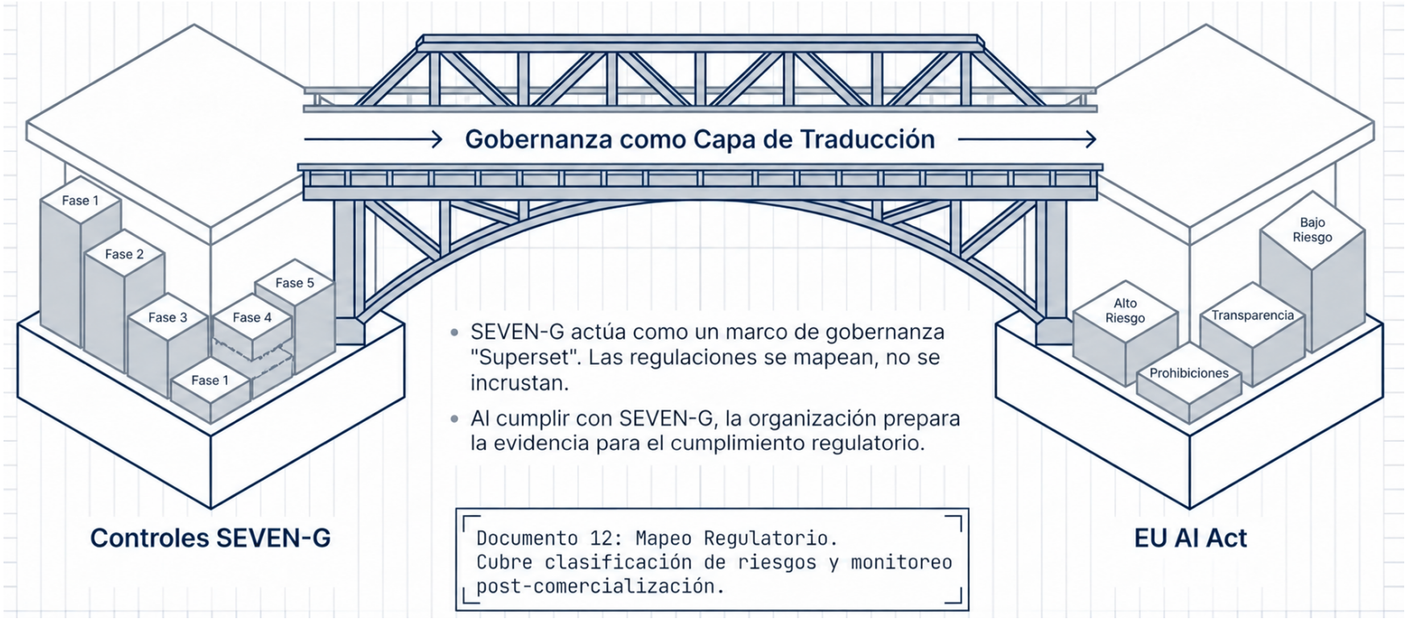

Organiza controles y evidencias para facilitar el mapeo regulatorio.

La presentación describe SEVEN-G como una capa de traducción entre sus controles y marcos como el EU AI Act. El mapeo relaciona riesgos y evidencias con los requisitos que correspondan a cada caso de uso; el diagrama representa ese enfoque metodológico y no acredita por sí mismo el cumplimiento.

Mide la madurez con evidencia observable

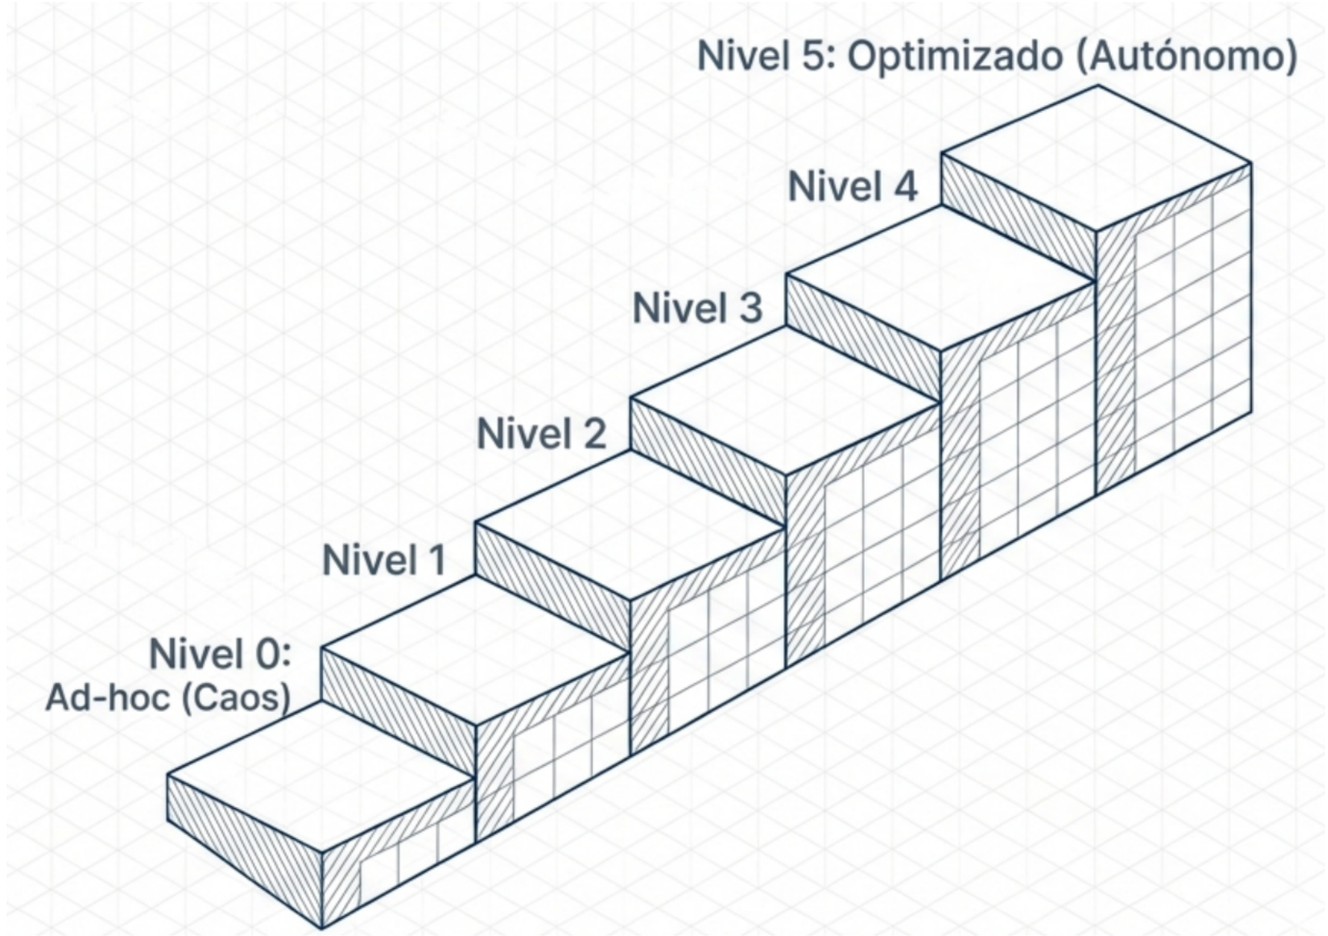

Avanza desde una gestión ad hoc hacia una gobernanza optimizada.

El modelo representa niveles del 0 al 5. La evaluación se apoya en cobertura de gobernanza, eficacia de controles de riesgo, estabilidad en producción y realización de valor auditada. La presentación solo nombra los extremos: ad hoc y optimizado; no se añaden definiciones para los niveles intermedios.

Haz que las decisiones dejen evidencia

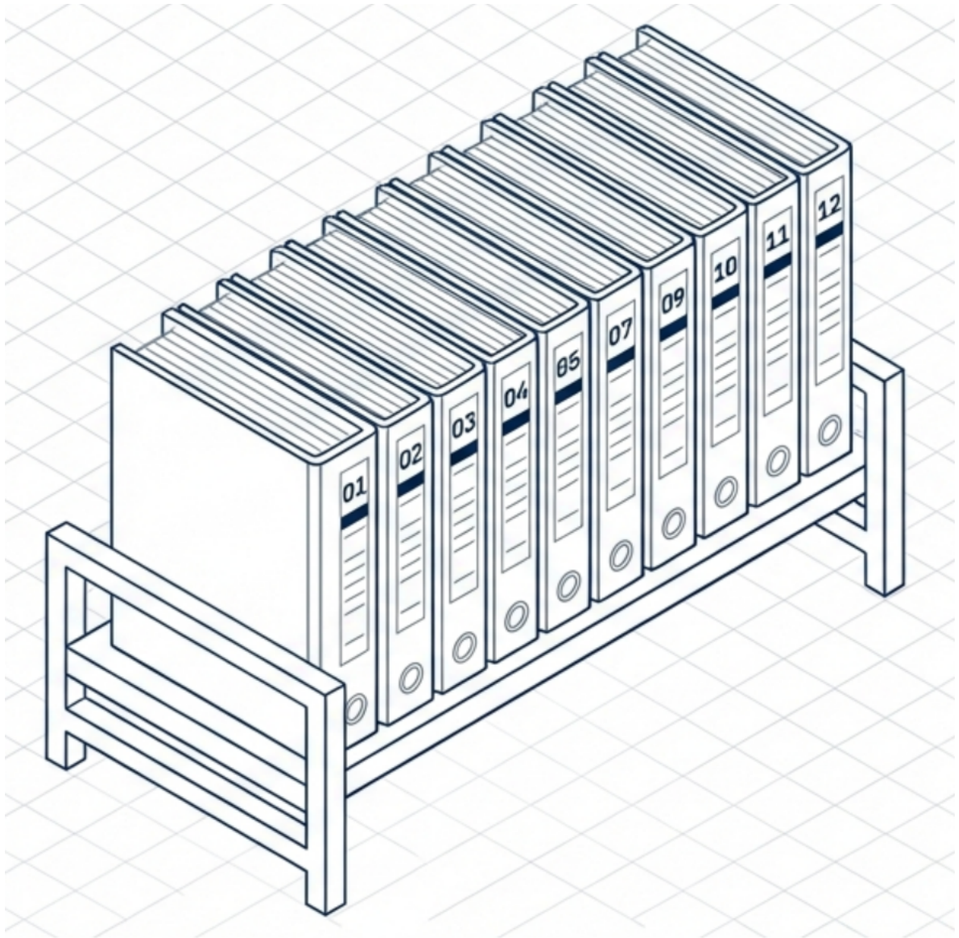

Reúne los artefactos de la iniciativa en el Master Print Pack.

El pack se presenta como un conjunto de 12 documentos. Entre los destacados están la metodología fundacional, el marco de auditoría, el charter de iniciativa, los criterios de compuerta y auditoría, las checklists de fase y el mapeo regulatorio. La documentación permite reconstruir y auditar lo ocurrido.

Empieza con una iniciativa piloto

Adopta el marco, asigna responsables y recorre el ciclo completo.

La propuesta de implantación tiene tres pasos: aprobar el uso del Master Print Pack, designar explícitamente al AI Auditor y al AI Sponsor, y ejecutar una iniciativa piloto a través de las fases 0 a 7. El piloto permite observar cómo funcionan las decisiones, los controles y las evidencias en conjunto.
