

DOCUMENTO 01 · METODOLOGÍA FUNDACIONAL

Metodología fundacional de SEVEN-G

Modelo, principios, ciclos de gobierno, puertas de decisión y roles

Fernando García · SEACHAD Versión 0.1 (borrador de trabajo) 16-09-2026 Borrador para revisión

10

principios

2

niveles de gobierno

8

fases por iniciativa

6

roles con
separación de
funciones

EN ESTE DOCUMENTO

01	Objeto y alcance	09	Intensidad de aplicación: Lite y Enterprise
02	El modelo SEVEN-G	10	Riesgos
03	Principios	11	Medición
04	Conceptos básicos	12	No conformidades
05	Nivel compañía · Ciclo corporativo	13	Regulación y normas de referencia
06	Nivel iniciativa · Ciclo de vida	14	Cómo se declara que se aplica SEVEN-G
07	Puertas de decisión	15	Documentos relacionados
08	Roles, órganos y separación de funciones	16	Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Objeto y alcance

Este documento define el modelo de SEVEN-G y las reglas que una organización debe aplicar para declarar que gobierna su inteligencia artificial con este marco. Es la referencia normativa del resto de documentos: los manuales, criterios, plantillas y herramientas desarrollan lo que aquí se establece y no pueden contradecirlo.

1.1 Qué contiene

- El modelo del marco: niveles de gobierno, componentes y relación entre ellos.

- Los principios y cómo se verifican.
- El ciclo corporativo, que gobierna la IA en la compañía.
- El ciclo de vida de cada iniciativa, con sus fases, evidencias y puertas de decisión.
- Las reglas de decisión, incluidas las diferencias según el nivel de ambición.
- Los roles, los órganos y la separación de funciones.
- La intensidad de aplicación (Lite o Enterprise) y cómo se determina.
- La integración de riesgos, medición, no conformidades y regulación.

El detalle operativo de cada tema se desarrolla en los documentos relacionados (sección 15).

1.2 Compatibilidad y adopción modular

SEVEN-G es compatible con estructuras de gobierno ya implantadas, con equipos de consultoría internos o externos y con marcos corporativos preexistentes de riesgo, control, tecnología o transformación. El marco no exige sustitución; su función es aportar un lenguaje común, trazabilidad de decisión y evidencia verificable para coordinar lo que la compañía ya hace con lo que necesita reforzar.

Su diseño es modular: puede implantarse completo o por componentes. Una organización puede empezar por una pieza concreta (por ejemplo, inventario, *gates*, medición o supervisión del consejo) y ampliar progresivamente el alcance sin romper la coherencia del método.

1.3 Qué se gobierna con SEVEN-G

Tipo de uso de IA	Ejemplos	Tratamiento en SEVEN-G
Iniciativas de IA	Modelos predictivos, soluciones de IA generativa, agentes, automatizaciones con IA desarrolladas o adaptadas por la compañía.	Ciclo de vida completo (fases 0–7) con la intensidad que corresponda.
IA de terceros integrada en procesos	Software de un proveedor con funciones de IA que intervienen en decisiones, operaciones o relación con clientes.	Ciclo de vida completo; las fases de diseño y entrega se centran en la selección, integración, contrato y controles del proveedor.
Uso corporativo de IA de propósito general	Asistentes y suites de productividad con IA usados por los empleados.	Inventario, política de uso aceptable, formación y controles técnicos. Pasa al ciclo completo si cumple algún criterio Enterprise (sección 9).
Uso no autorizado	Herramientas de IA usadas sin aprobación.	Se detecta, se registra y se regulariza (autorización, sustitución o bloqueo) como no conformidad.

1.4 Convenciones de lenguaje

Término	Significado
debe	Requisito obligatorio. Su incumplimiento es una no conformidad.
debería	Recomendación. Puede omitirse si se justifica y se registra.
puede	Opción permitida.


02

El modelo SEVEN-G

SEVEN-G significa *Seven-phase Enterprise Value & Governance*. El nombre expresa las tres ideas del marco:

- **Siete fases de valor** por las que pasa cada iniciativa, precedidas de una fase 0 que la autoriza.
- **Valor empresarial** como criterio de todas las decisiones.
- **Gobierno** presente en cada fase y en la compañía en su conjunto.

Dos niveles de gobierno conectados y cuatro componentes transversales



Elemento	Qué es	Quién lo usa
Ciclo corporativo	Diagnóstico, dirección, cartera, supervisión y revisión de la IA en la compañía.	Consejo, alta dirección, comité de IA.
Ciclo de vida de la iniciativa	Fases 0–7 con puertas de decisión auditable.	Equipos de iniciativa, riesgos, auditor de IA, comité de IA.
A • Mapa de impacto	Nueve esferas de impacto y tres niveles de ambición.	Consejo y dirección para decidir dónde y cuánto apostar; equipos para clasificar iniciativas.
B • Sistema de gobierno	Roles, órganos, riesgos, regulación, terceros y no conformidades.	Todos los niveles.
C • Sistema de medición	Reglas de valor, indicadores, madurez e índice de transformación.	Consejo, comité de IA, control de gestión, equipos.
D • Herramientas	Plantillas, listas de verificación, panel del consejo y registro de recomendaciones.	Todos los niveles.

Los dos ciclos están conectados: **el ciclo corporativo autoriza y financia** las iniciativas dentro de una cartera, y **cada iniciativa reporta evidencias** que alimentan la supervisión y la revisión anual.

03

Principios

Los principios orientan las decisiones en las situaciones que las reglas no cubren. Cada principio tiene una forma de verificarse.

#	Principio	Qué implica en la práctica	Cómo se verifica
1	Valor antes que tecnología	Toda iniciativa parte de un problema u oportunidad de negocio y se vincula a un resultado medible.	Existe una hipótesis de valor aprobada antes de invertir en construcción.
2	El gobierno no es opcional	Los controles se diseñan desde el principio y permiten avanzar más rápido con menos riesgo.	Ninguna iniciativa en construcción carece de fase 0 aprobada.
3	La producción es la única verdad	El valor se demuestra en condiciones reales, no en pruebas de concepto.	El valor declarado en producción tiene estado de validación.
4	Reversibilidad	Toda solución puede detenerse, revertirse o retirarse sin comprometer la operación.	Existe plan de reversión probado antes de la puesta en producción.
5	El riesgo es sistémico	El riesgo se gestiona en cartera, además de caso por caso.	El comité de IA revisa la concentración de riesgos de la cartera.
6	Evolucionar o retirar	Ninguna iniciativa permanece sin evidencia que lo justifique.	Todas las iniciativas en producción tienen revisión de continuidad vigente.
7	Separación de funciones	Quien construye no controla y nadie se aprueba a sí mismo.	Las decisiones de <i>gate</i> registran decisor y verificador distintos del equipo.
8	Evidencia, no declaración	Lo que no está documentado y verificado no se considera realizado.	Las evidencias tienen autor, fecha, versión y verificación.
9	Decisión consciente sobre la ambición	Eficiencia y transformación se eligen, se miden y se deciden por separado.	Toda iniciativa tiene nivel de ambición clasificado y confirmado.
10	Las personas en el centro del cambio	La IA se evalúa también por su efecto en el trabajo, las capacidades y las responsabilidades.	Las iniciativas de Aumentar y Transformar tienen plan de adopción y de personas.

Conceptos básicos

Las definiciones completas están en el documento 02 (Glosario).

Concepto	Definición en SEVEN-G
Sistema de IA	Sistema basado en máquinas que, con distintos niveles de autonomía, infiere a partir de los datos que recibe cómo generar resultados —predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones— que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Se alinea con la definición del Reglamento Europeo de IA .
Iniciativa	Conjunto de trabajo que persigue una hipótesis de valor mediante uno o varios sistemas de IA. Es la unidad que recorre el ciclo de vida.
Caso de uso	Aplicación concreta de un sistema de IA a un proceso o decisión. Una iniciativa puede incluir varios casos de uso.
Cartera	Conjunto de iniciativas autorizadas, con su presupuesto, prioridad y equilibrio de ambición.
Esfera	Dominio de impacto de la IA en la organización. Hay nueve (documento 10).
Nivel de ambición	Tipo de apuesta: Optimizar, Aumentar o Transformar.
Intensidad	Grado de exigencia con el que se aplica el ciclo: Lite o Enterprise.
Gate	Puerta de decisión al final de una fase, en la que se decide si la iniciativa continúa y en qué condiciones.
Evidencia	Documento, registro o resultado verificable que demuestra que se ha cumplido un criterio.
Validación dual	Regla por la que un <i>gate</i> exige a la vez resultados tangibles y documentación verificada.
No conformidad	Incumplimiento de un requisito del marco, clasificado como menor, mayor o crítico.

Nivel compañía · Ciclo corporativo

El ciclo corporativo es el mecanismo con el que el consejo y la alta dirección ejercen su responsabilidad sobre la IA. Se recorre de forma anual, con supervisión continua.

5.1 Etapas

Etapa	Objetivo	Resultados obligatorios	Responsable	Aprueba
C1 · Diagnóstico	Conocer la situación real de la IA en la compañía.	Inventario de sistemas de IA; evaluación de madurez con evidencia; mapa de esferas actual; perfil del índice de transformación; valor validado y coste actuales.	Oficina de IA	Comité de IA; se presenta al consejo
C2 · Dirección	Decidir dónde jugar, con qué ambición y con qué apetito de riesgo.	Tesis de IA; nivel de ambición por esfera; apetito de riesgo y umbrales (incluidos los de intensidad Enterprise y el horizonte de retorno); política corporativa de IA; presupuesto marco.	Alta dirección	Consejo
C3 · Cartera	Seleccionar, priorizar y equilibrar las iniciativas.	Cartera priorizada con nivel de ambición, esfera, intensidad, presupuesto y responsables; criterios de retirada; capacidad disponible.	Comité de IA	Comité de IA; el consejo aprueba las iniciativas de Transformar
C4 · Supervisión	Comprobar que se cumple lo decidido y actuar sobre las desviaciones.	Panel del consejo; registro de recomendaciones y decisiones; resultados de <i>gates</i> relevantes; incidentes y no conformidades; riesgos principales de la cartera.	Oficina de IA	Comité de IA (mensual); consejo o comisión delegada (trimestral)
C5 · Revisión	Evaluar el avance y ajustar la dirección.	Revisión de madurez e índice de transformación; cumplimiento de la tesis; lecciones aprendidas; propuesta de ajustes para el nuevo ciclo.	Oficina de IA con auditoría interna	Consejo

5.2 Calendario de gobierno

Órgano	Frecuencia	Qué revisa
Consejo de administración	Anual (C2, C5) y trimestral (C4)	Tesis, ambición, apetito de riesgo, iniciativas de Transformar, panel del consejo, perfil de transformación.
Comisión delegada (auditoría, riesgos o tecnología)	Trimestral	Riesgos, cumplimiento regulatorio, incidentes, no conformidades mayores y críticas, auditorías.
Comité de IA	Mensual	Cartera, <i>gates</i> Enterprise, desviaciones de valor y coste, riesgos concentrados, retiradas.
Oficina de IA	Continua	Inventario, metodología, consolidación de la medición, soporte a los equipos, preparación de la información.

Órgano	Frecuencia	Qué revisa
Auditor de IA	En cada <i>gate</i> Enterprise y por muestreo en Lite	Verificación de evidencias y cierre de no conformidades.

5.3 Primera implantación

Una organización que adopta SEVEN-G por primera vez debería concentrar C1 a C3 en noventa días:

Periodo	Objetivo	Resultado
Mes 1	Diagnóstico	Inventario inicial, madurez con evidencia y perfil de transformación.
Mes 2	Riesgos y oportunidades	Principales riesgos y oportunidades por esfera, con responsable, impacto económico y plazo.
Mes 3	Estructura de gobierno	Órganos, roles, umbrales, <i>gates</i> , métricas y ritmo de reporte aprobados.

El detalle está en el documento 90 (Guía de implantación).

06

Nivel iniciativa · Ciclo de vida

Cada iniciativa recorre ocho fases. Al final de cada una hay una puerta de decisión (*gate*); en la fase 6 la puerta se sustituye por una revisión periódica de continuidad.

Ciclo de vida de la iniciativa

Ocho fases con puertas de decisión auditables y capacidad real de parar



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

6.1 Resumen de fases y puertas

Fase	Nombre	Pregunta que responde	Puerta de decisión
0	Contexto y restricciones	¿Está autorizada la iniciativa y en qué marco?	G0 · Autorización
1	Descubrimiento de oportunidades	¿Hay una oportunidad de negocio que requiere IA?	G1 · Oportunidad
2	Hipótesis de valor	¿Qué valor esperamos, cómo lo mediremos y cómo sabremos que ha fallado?	G2 · Hipótesis
3	Viabilidad y riesgo	¿Es viable técnica, económica, regulatoria y organizativamente, con un riesgo aceptable?	G3 · Viabilidad (principal puerta de parada)
4	Diseño de la solución	¿Cómo se construye con control, supervisión humana y reversibilidad?	G4 · Diseño
5	Entrega y validación	¿Funciona y aporta valor en condiciones reales?	G5 · Puesta en producción
6	Operación y gobierno	¿Sigue funcionando, aportando valor y bajo control?	R6 · Revisión de continuidad (periódica)
7	Evolución o retirada	¿Escalamos, iteramos o retiramos?	G7 · Escalado o retirada

6.2 Fase 0 · Contexto y restricciones

Objetivo	Autorizar formalmente la iniciativa y fijar el marco en el que se desarrollará.
Actividades	Identificar el objetivo estratégico y la esfera; declarar restricciones regulatorias, éticas, de datos, presupuestarias y de plazo; asignar los roles; determinar la intensidad (Lite o Enterprise); registrar la iniciativa en el inventario.
Evidencias obligatorias	Carta de la iniciativa · Declaración de contexto y restricciones · Registro de asignación de roles · Determinación de intensidad · Alta en el inventario.
Criterio de salida	Patrocinador comprometido, roles asignados sin incompatibilidades, encaje con la tesis de IA y la cartera, y restricciones conocidas.
Regla específica	Sin G0 aprobado, la iniciativa no está autorizada: no puede consumir presupuesto ni acceder a datos de producción.

6.3 Fase 1 · Descubrimiento de oportunidades

Objetivo	Identificar oportunidades desde el negocio y descartar las que no requieren IA o no tienen valor plausible.
Actividades	Analizar el proceso o la decisión afectada; identificar alternativas sin IA; estimar el orden de magnitud del valor; proponer esfera y nivel de ambición con los criterios del documento 12.
Evidencias obligatorias	Cartera de oportunidades con notas de filtrado · Alternativas sin IA consideradas · Esfera y nivel de ambición propuestos.
Criterio de salida	La oportunidad nace de una necesidad de negocio, la IA aporta algo que las alternativas no aportan y el valor potencial justifica formular una hipótesis.

6.4 Fase 2 · Hipótesis de valor

Objetivo	Formular una hipótesis de valor medible y falsable. Una hipótesis que no puede fallar no es válida.
Actividades	Definir la métrica principal y las secundarias; medir la línea base; fijar el objetivo y el umbral de éxito; elegir el método de atribución (grupo de control, antes y después, u otro justificado); estimar valor en dinero con fórmula; confirmar el nivel de ambición; definir los criterios de parada.
Evidencias obligatorias	Lienzo de hipótesis de valor · Métricas de línea base · Método de atribución · Confirmación del nivel de ambición · Criterios de parada.
Criterio de salida	Hipótesis falsable, línea base medida (no estimada salvo justificación), valor expresado en dinero con fórmula y criterios de parada definidos antes de invertir.
Regla específica	En las iniciativas de Transformar, la hipótesis puede tener mayor incertidumbre, pero debe incluir hitos de aprendizaje, límite de inversión por etapa y decisión explícita del consejo.

6.5 Fase 3 · Viabilidad y riesgo

Objetivo	Decidir si la iniciativa es viable con un riesgo aceptable. Es la principal puerta de parada del ciclo.
Actividades	Evaluar la viabilidad técnica y la disponibilidad y calidad de los datos; estimar costes completos (construcción, recurrentes y de adopción); clasificar la iniciativa según la regulación aplicable; realizar las evaluaciones de impacto que correspondan (protección de datos, derechos fundamentales); identificar y valorar riesgos; evaluar proveedores; valorar el impacto en personas.
Evidencias obligatorias	Evaluación de viabilidad · Clasificación regulatoria · Evaluaciones de impacto aplicables · Matriz y registro de riesgos · Plan de mitigación y contingencia · Evaluación de proveedores, si los hay.

Criterio de salida	Viabilidad demostrada con datos reales; ningún riesgo crítico sin mitigación aceptada; clasificación regulatoria realizada con criterio jurídico; neto esperado coherente con el apetito de riesgo y el horizonte fijados en C2.
Regla específica	Las prácticas prohibidas por la regulación no pasan de esta fase en ningún caso.

6.6 Fase 4 · Diseño de la solución

Objetivo	Diseñar una solución controlable, supervisable y reversible.
Actividades	Definir la arquitectura; documentar el linaje de datos y modelos; diseñar la supervisión humana (qué decide el sistema, qué valida una persona y qué no se delega nunca); diseñar controles de seguridad, incluidos identidad, permisos y límites de actuación de los agentes; definir la monitorización; preparar el plan de reversión; diseñar la adopción.
Evidencias obligatorias	Registro de arquitectura · Linaje de datos y modelos · Diseño de gobierno y supervisión humana · Diseño de seguridad · Plan de reversión · Plan de adopción.
Criterio de salida	El diseño cubre los controles exigidos por la clasificación de riesgo; la supervisión humana está definida; existe un mecanismo de parada; los riesgos de fase 3 tienen control diseñado.

6.7 Fase 5 · Entrega y validación

Objetivo	Construir, probar y demostrar el valor en condiciones reales antes de la puesta en producción definitiva.
Actividades	Construir o integrar la solución; realizar pruebas funcionales, de rendimiento, de sesgo, de robustez y de seguridad (incluidas pruebas de inyección de instrucciones en IA generativa y agentes); ejecutar un piloto con medición según el método de atribución; probar el plan de reversión; formar a los usuarios.
Evidencias obligatorias	Informe de entrega · Resultados de validación y de pruebas · Resultados del piloto frente a la hipótesis · Prueba del plan de reversión · Registro de riesgos actualizado · Registro de firma de puesta en producción.
Criterio de salida	Los resultados del piloto cumplen el umbral de éxito o lo hacen con condiciones aceptadas; los controles críticos funcionan; la operación está preparada.
Regla específica	La puesta en producción de una iniciativa Enterprise requiere firma multinivel con capacidad de veto : responsable técnico, riesgos y cumplimiento, seguridad de la información y protección de datos. Cada firma queda registrada.

6.8 Fase 6 · Operación y gobierno

Objetivo	Operar con estabilidad, mantener el control y seguir midiendo el valor.
Actividades	Monitorizar rendimiento, degradación, sesgo, costes y seguridad; gestionar incidentes; realizar la vigilancia posterior a la comercialización que exija la regulación; medir el valor realizado; gestionar cambios.
Evidencias obligatorias	Manual de operación · Configuración de monitorización y alertas · Plan de respuesta a incidentes · Registro de incidentes y cambios · Seguimiento de realización de valor.
Revisión de continuidad (R6)	Al menos trimestral en Enterprise y semestral en Lite. Comprueba valor realizado frente a hipótesis, estabilidad, incidentes, cumplimiento y vigencia de la clasificación de riesgo. Si detecta desviaciones relevantes, adelanta el <i>gate</i> G7.

6.9 Fase 7 · Evolución o retirada

Objetivo	Decidir con evidencia si la iniciativa se escala, se itera o se retira.
Actividades	Consolidar el valor realizado y su estado de validación; revisar el nivel de ambición real frente al declarado; evaluar riesgos acumulados; si se retira, planificar la retirada.
Evidencias obligatorias	Seguimiento de realización de valor · Registro de decisión de escalado o retirada · Lecciones aprendidas · Plan de retirada, si procede.
Resultados posibles	Escalar (nueva fase 0 para el alcance ampliado), Iterar (vuelta a la fase que corresponda; si se mantiene sin cambios, vuelta a la fase 6) o Retirar .
Regla específica	Toda retirada registra fecha, motivo, órgano que decide, sustituto si lo hay, tratamiento de datos y modelos, y comunicación a los afectados.

6.10 Mapa de evidencias

Fase Evidencias obligatorias

0	Carta de la iniciativa · Declaración de contexto y restricciones · Registro de asignación de roles · Determinación de intensidad · Alta en el inventario
1	Cartera de oportunidades y notas de filtrado · Alternativas sin IA · Esfera y nivel de ambición propuestos
2	Lienzo de hipótesis de valor · Línea base · Método de atribución · Confirmación de ambición · Criterios de parada

Fase Evidencias obligatorias

3	Evaluación de viabilidad · Clasificación regulatoria · Evaluaciones de impacto · Matriz y registro de riesgos · Plan de mitigación y contingencia · Evaluación de proveedores
4	Registro de arquitectura · Linaje de datos y modelos · Diseño de gobierno y supervisión humana · Diseño de seguridad · Plan de reversión · Plan de adopción
5	Informe de entrega · Resultados de validación y pruebas · Resultados del piloto · Prueba de reversión · Registro de riesgos actualizado · Firma de puesta en producción
6	Manual de operación · Monitorización y alertas · Plan de respuesta a incidentes · Registro de incidentes y cambios · Seguimiento de valor
7	Seguimiento de realización de valor · Decisión de escalado o retirada · Lecciones aprendidas · Plan de retirada

Las plantillas de cada evidencia forman parte del bloque H de la biblioteca documental.

6.11 Trazabilidad del ciclo de vida

La cartera de IA se gestiona como un embudo, del mismo modo que una organización comercial gestiona sus oportunidades. Para ello, toda iniciativa debe estar dada de alta en el **registro de iniciativas** (documento 03, herramienta T01) y el registro debe conservar, como mínimo:

- La **fecha de entrada y salida de cada fase**, y los periodos en espera con su motivo.
- La **solicitud, verificación y decisión de cada gate**, con su resultado, iteración, decisor y verificador.
- El **estado de cada criterio del gate** (cumple, no cumple, no aplica o pendiente) con la evidencia enlazada.
- Las **condiciones** impuestas, con plazo, responsable y estado.
- Las **etiquetas de la taxonomía controlada**: esfera, nivel de ambición, intensidad, clasificación regulatoria, tecnología, exposición y tipo de valor.
- El **motivo codificado** de toda parada o retirada.

La compañía aprueba en C2 los **plazos de referencia por fase** y el plazo máximo de decisión de un *gate*. Las iniciativas que los superan se señalan como estancadas y se revisan en el comité de IA.


Puertas de decisión

7.1 Cómo funciona una puerta

Cada *gate* sigue la misma secuencia: el equipo aporta las evidencias, el verificador comprueba que son completas y válidas, y el órgano competente decide.

Lógica de una puerta de decisión

La decisión solo se toma sobre evidencias verificadas

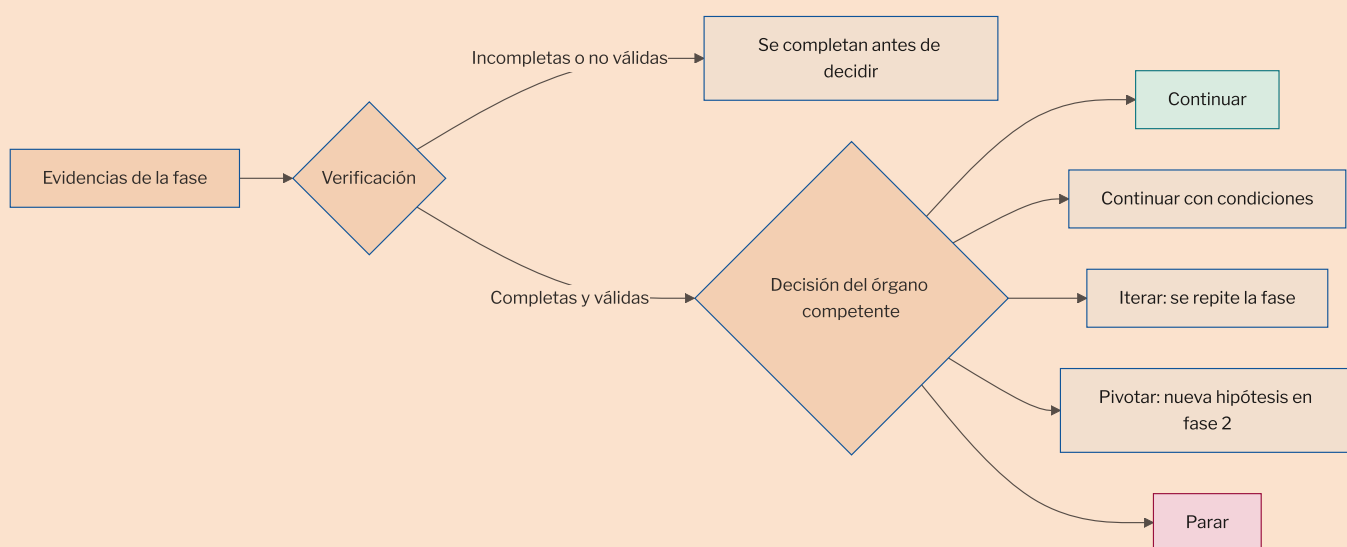

Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

7.2 Validación dual

Un *gate* solo puede superarse si se cumplen a la vez dos condiciones:

1. **Resultados tangibles:** los criterios de la fase se cumplen con datos, pruebas o resultados reales.
2. **Documentación verificada:** las evidencias obligatorias existen, son trazables (autor, fecha y versión) y han sido verificadas por quien corresponde.

Resultados sin documentación, o documentación sin resultados, no superan el *gate*.

7.3 Resultados posibles

Resultado	Cuándo se aplica	Consecuencia
Continuar	Se cumplen todos los criterios y todas las evidencias están verificadas.	La iniciativa pasa a la fase siguiente.
Continuar con condiciones	Se cumplen los criterios esenciales y quedan aspectos no críticos pendientes.	Pasa a la fase siguiente con condiciones explícitas, plazo y responsable. Las condiciones se verifican en el siguiente <i>gate</i> . No se admite para controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana.
Iterar	Los resultados son insuficientes pero la hipótesis sigue siendo plausible.	Se repiten las actividades de la fase y se vuelve al mismo <i>gate</i> .
Pivotar	La hipótesis no se sostiene, pero existe una alternativa razonable. Solo en G1, G2 y G3.	Se vuelve a la fase 2 con una nueva hipótesis, conservando el contexto aprobado.
Parar	No hay valor plausible, la viabilidad no se demuestra o el riesgo es inaceptable.	La iniciativa se cierra, se registran las lecciones aprendidas y se liberan los recursos.
Escalar	Solo en G7: valor demostrado y riesgo controlado.	Nueva fase 0 para el alcance ampliado.
Retirar	Solo en G7: el valor no se sostiene, el riesgo ha aumentado o existe una alternativa mejor.	Retirada planificada y registrada.
Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7	Solo en R6: la iniciativa sigue aportando valor bajo control, lo hace con desviaciones corregibles, o presenta desviaciones relevantes de valor, riesgo o cumplimiento.	Sigue en producción; con condiciones, plazo y responsable; o se abre G7 sin esperar al calendario.

Una decisión de **parar** bien fundamentada es un resultado válido del método. Evitar una mala inversión también es generar valor.

7.4 Reglas de decisión

- 1. Nadie decide sobre su propio trabajo.** Quien aporta evidencias no las verifica ni decide.
- 2. Sin evidencia obligatoria no hay decisión.** El órgano competente no puede decidir sobre evidencias incompletas.
- 3. Las evidencias deben existir antes del *gate*.** La documentación elaborada a posteriori para justificar un avance ya producido invalida el *gate* y constituye una no conformidad mayor.

4. **Las condiciones tienen plazo y responsable.** Una condición vencida sin cumplir convierte el resultado en **Iterar**.
5. **Límite de iteraciones.** Tras dos iteraciones en el mismo *gate*, la decisión se eleva al órgano superior.
6. **Los criterios de parada se fijan antes.** No pueden relajarse durante la fase para evitar una decisión de parar sin aprobación del órgano que autorizó la iniciativa.
7. **Toda decisión queda registrada** en el registro de decisión de *gate*, con resultado, motivo, condiciones, decisor y verificador.

7.5 Quién verifica y quién decide

Puerta	Verifica (Lite)	Decide (Lite)	Verifica (Enterprise)	Decide (Enterprise)
G0 · Autorización	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA
G1 · Oportunidad	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Patrocinador, informando al comité
G2 · Hipótesis	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA
G3 · Viabilidad	Oficina de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos	Auditor de IA	Comité de IA
G4 · Diseño	Oficina de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos	Auditor de IA	Comité de IA
G5 · Puesta en producción	Oficina de IA	Patrocinador con conformidad de riesgos	Auditor de IA	Comité de IA tras firma multinivel
R6 · Continuidad	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA
G7 · Escalado o retirada	Oficina de IA	Patrocinador	Auditor de IA	Comité de IA

Las iniciativas de **Transformar** requieren además aprobación del consejo en G2 (autorización de la apuesta) y en G7 cuando se decide escalar. En la intensidad **Lite**, G0, G1 y G2 pueden resolverse en una sola sesión, y G4 y G5 también, siempre que cada evidencia se verifique.

7.6 Criterios diferenciados por nivel de ambición

Aplicar los mismos criterios de retorno a una iniciativa de eficiencia y a una apuesta de transformación bloquea las segundas o infla las primeras. Por eso los *gates* clave se evalúan de forma diferente:

Puerta	Optimizar	Aumentar	Transformar
G2 · Hipótesis	Línea base de coste, tiempo o errores; ahorro esperado con fórmula.	Métricas de rendimiento y de coste; objetivo de adopción.	Hipótesis de retorno con hitos de aprendizaje; límite de inversión por etapa; aprobación del consejo.
G3 · Viabilidad	Neto anual esperado positivo y VAN ≥ 0 dentro del horizonte y con la tasa fijados en C2 (documento 40).	Viabilidad de la adopción y del cambio de rol, además del neto esperado.	Viabilidad de la primera etapa; criterios de parada por etapa; valor de opción documentado.
G5 · Puesta en producción	Eficiencia validada frente a la línea base; plan para materializar la capacidad liberada.	Adopción real y mejora de rendimiento medidas.	Evidencia de mercado o de cliente: uso, conversión, ingresos iniciales o cambio operativo verificado.
G7 · Escalado o retirada	Ahorro materializado, no solo capacidad liberada.	Rendimiento sostenido y capacidad reasignada.	Retorno medido y cambio del modelo operativo o de la oferta verificado.

08

Roles, órganos y separación de funciones

8.1 Roles de la iniciativa

Rol	Función	Responsabilidad	No puede
Patrocinador de IA	Decide	Responde del valor y de la inversión; defiende la iniciativa ante los órganos de decisión.	Verificar evidencias ni actuar como responsable de riesgos o auditor de su iniciativa.
Responsable de producto de IA	Construye	Responde de la hipótesis de valor, del uso real y de la adopción.	Verificar evidencias ni decidir <i>gates</i> de su iniciativa.
Responsable técnico de IA	Construye	Responde de la solución, los datos, los modelos y su documentación técnica.	Verificar evidencias ni decidir <i>gates</i> de su iniciativa.
Responsable de operación de IA	Construye	Responde de la estabilidad, la monitorización, los incidentes y los cambios en producción.	Verificar evidencias de su propia operación.

Rol	Función	Responsabilidad	No puede
Responsable de riesgos de IA	Controla	Responde de la evaluación y el seguimiento de riesgos y cumplimiento, y emite conformidad.	Formar parte del equipo que construye la iniciativa.
Auditor de IA	Controla	Verifica evidencias en los <i>gates</i> Enterprise y cierra no conformidades.	Participar en el diseño, construcción u operación de la iniciativa, ni depender jerárquicamente del patrocinador.

Una persona puede asumir más de un rol si no son incompatibles (sección 8.2). En organizaciones pequeñas, el auditor de IA puede ser externo o proceder de auditoría interna.

8.2 Incompatibilidades

	Patrocinador	Producto	Técnico	Operación	Riesgos	Auditor
Patrocinador	—	Compatible en Lite	Compatible en Lite	Compatible en Lite	Incompatible	Incompatible
Producto		—	Compatible	Compatible	Incompatible	Incompatible
Técnico			—	Compatible	Incompatible	Incompatible
Operación				—	Incompatible	Incompatible
Riesgos					—	Incompatible en Enterprise
Auditor						—

8.3 Órganos de la compañía

Órgano	Composición orientativa	Funciones en SEVEN-G
Consejo de administración o comisión delegada	Consejeros; puede apoyarse en un consejero o asesor con experiencia en IA.	Aprueba la tesis de IA, la ambición, el apetito de riesgo y las iniciativas de Transformar; supervisa trimestralmente; revisa anualmente el avance.
Comité de IA	Alta dirección de negocio, tecnología, datos, riesgos, cumplimiento, seguridad, protección de datos y personas.	Gestiona la cartera; decide los <i>gates</i> Enterprise; revisa riesgos de cartera; decide retiradas; eleva al consejo lo que corresponda.

Órgano	Composición orientativa	Funciones en SEVEN-G
Oficina de IA	Equipo reducido de metodología, cartera y medición.	Mantiene el inventario y la metodología; verifica en Lite; consolida la medición; prepara la información de los órganos.
Segunda línea	Riesgos, cumplimiento, seguridad de la información, protección de datos.	Aporta los responsables de riesgos; emite conformidades; firma la puesta en producción Enterprise.
Tercera línea	Auditoría interna o auditor externo.	Aporta o supervisa a los auditores de IA; audita el cumplimiento del marco.

SEVEN-G no crea un gobierno paralelo: los órganos pueden ser comités existentes con el mandato ampliado.

8.4 Responsabilidades por fase

A responde del resultado · R realiza el trabajo · C es consultado · I es informado · V verifica las evidencias en el *gate*.

Fase	Patrocinador	Producto	Técnico	Operación	Riesgos	Auditor
0 · Contexto	A	R	C	I	C	V
1 · Descubrimiento	A	R	C	I	C	V
2 · Hipótesis de valor	A	R	C	I	C	V
3 · Viabilidad y riesgo	A	R	R	C	R	V
4 · Diseño	I	C	A/R	C	C	V
5 · Entrega y validación	I	A	R	C	C	V
6 · Operación	I	C	C	A/R	C	V
7 · Evolución o retirada	A	R	C	C	C	V


Intensidad de aplicación: Lite y Enterprise

9.1 Cómo se determina

La intensidad se determina en la fase 0 y se revisa en G3 y en cada revisión de continuidad. Basta con que se cumpla un criterio Enterprise para aplicar esa intensidad.

Determinación de la intensidad

Se evalúa en la fase 0 y se revisa en G3 y en cada revisión de continuidad. Basta un «sí» para aplicar Enterprise

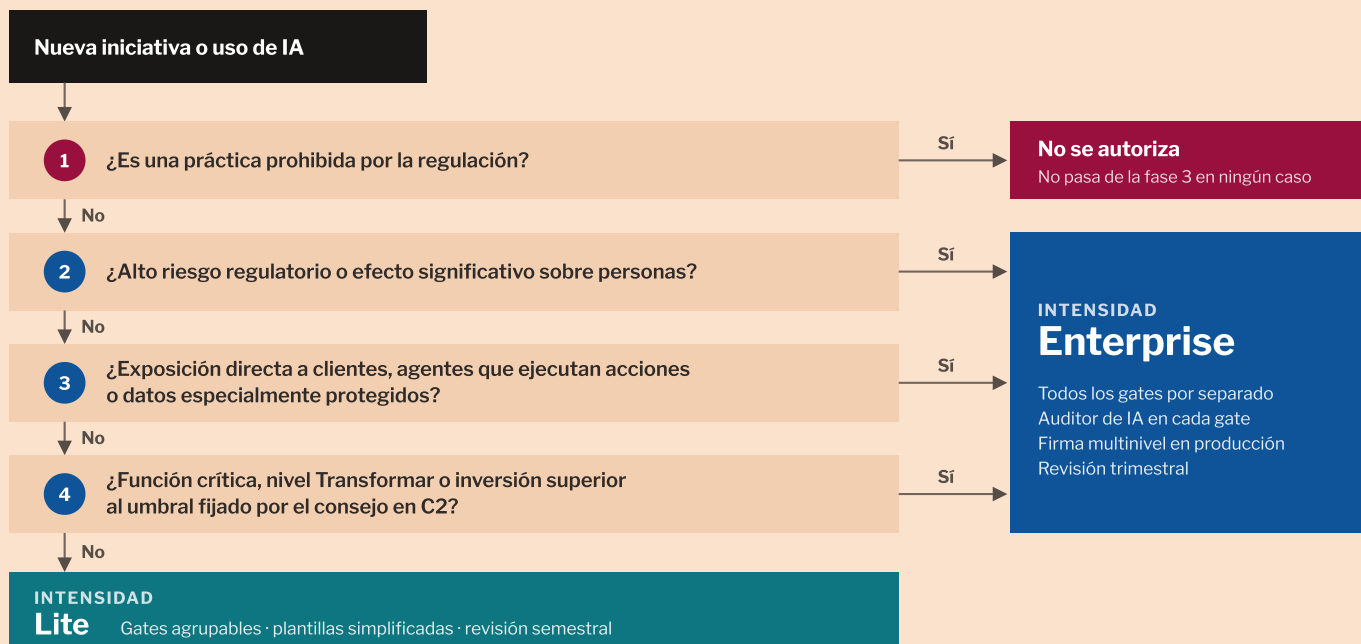

Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

9.2 Criterios Enterprise

Criterio	Descripción
Alto riesgo regulatorio	El sistema está clasificado como de alto riesgo según la regulación aplicable.
Decisiones sobre personas	El resultado influye de forma significativa en decisiones que afectan a personas (empleo, crédito, seguros, acceso a servicios, entre otras).
Exposición directa	Clientes, pacientes, ciudadanos u otras personas externas interactúan directamente con el sistema.

Criterio	Descripción
Agentes con capacidad de actuar	El sistema ejecuta acciones —escribir en sistemas, enviar comunicaciones, realizar pagos— sin que una persona valide cada acción antes de ejecutarla (autonomía A2 o A3, documento 35), y esas acciones tienen efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción.
Datos especialmente protegidos	Trata categorías especiales de datos personales o información confidencial crítica.
Función crítica	Soporta una función crítica o importante del negocio o sujeta a regulación sectorial de resiliencia operativa.
Nivel Transformar	La iniciativa está clasificada como Transformar.
Inversión	La inversión supera el umbral aprobado por el consejo en C2.

9.3 Qué cambia entre intensidades

Aspecto	Lite	Enterprise
Puertas	G0–G2 y G4–G5 pueden agruparse	Todas por separado
Evidencias	Plantillas simplificadas	Plantillas completas
Verificación	Oficina de IA; auditor de IA por muestreo	Auditor de IA en todos los <i>gates</i>
Decisión	Patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5	Comité de IA; consejo en Transformar
Puesta en producción	Conformidad de riesgos	Firma multinivel con veto
Revisión de continuidad	Semestral	Trimestral
Visibilidad	Panel del consejo agregado	Panel del consejo por iniciativa

10

Riesgos

SEVEN-G gestiona los riesgos en dos niveles: en cada iniciativa (fase 3 y seguimiento continuo) y en la cartera (comité de IA). La metodología completa está en el documento 33.

Categoría	Ejemplos
Estratégico	Desalineación con la tesis de IA; dependencia de una apuesta; pérdida de oportunidad.
Técnico	Rendimiento insuficiente; degradación; falta de robustez; alucinaciones en IA generativa.
Datos	Calidad, disponibilidad, sesgo, base legal para su uso.
Económico	Sobrecoste; valor no materializado; costes recurrentes crecientes.
Legal y cumplimiento	Clasificación regulatoria errónea; incumplimiento de obligaciones de transparencia, supervisión o protección de datos.
Organizativo	Falta de adopción; pérdida de conocimiento; efecto no gestionado sobre las personas.
Reputacional	Resultados discriminatorios; errores visibles para clientes; uso percibido como inadecuado.

Estas categorías se completan con tres ámbitos que requieren controles específicos:

- **IA generativa y agentes:** inyección de instrucciones, fuga de información, permisos excesivos, acciones no autorizadas, ausencia de trazabilidad de la intención de cada acción.
- **Exposición a ataques que usan IA:** suplantación, automatización de ataques, explotación acelerada de vulnerabilidades. Su detalle está en el documento 35.
- **Terceros y proveedores de IA:** dependencia tecnológica, uso de datos por el proveedor, cambios de modelo no comunicados, concentración y salida. Su detalle está en el documento 36.

11

Medición

La medición se integra en el ciclo de vida y en el ciclo corporativo. Las reglas de medición del valor (documento 00, sección 6, y documento 40) se aplican en todos los casos.

Momento	Qué se mide	Para qué
Fase 2	Línea base, objetivo y umbral de éxito; valor esperado en dinero con fórmula.	Hacer falsable la hipótesis.
Fase 3	Costes completos y neto esperado.	Decidir la viabilidad económica.
Fase 5	Resultados del piloto con el método de atribución.	Demostrar el valor antes de producción.

Momento	Qué se mide	Para qué
Fase 6	Valor realizado, costes reales, rendimiento, incidentes, adopción.	Mantener el control y detectar desviaciones.
Fase 7	Valor realizado validado; ambición real frente a declarada.	Decidir escalado o retirada.
C1 y C5	Madurez con evidencia; índice de transformación; valor y coste de la cartera.	Diagnosticar y revisar la dirección.
C4	Panel del consejo; agilidad de decisión (tiempo desde la idea hasta la aprobación y la producción).	Supervisar.
Continuo	Métricas del embudo: tiempo en fase, tiempo de decisión, conversión por <i>gate</i> , iteraciones, iniciativas estancadas, condiciones vencidas y motivos de parada (documento 03).	Gestionar la cartera como un embudo y detectar cuellos de botella.

Todo importe declarado tiene uno de tres estados: **validado** (por control de gestión o auditoría), **declarado** (por el área responsable) o **estimado** (por el comité, el consejo o el equipo evaluador).


12

No conformidades

Una no conformidad es cualquier incumplimiento de un requisito obligatorio del marco. Se gestiona con un proceso único; el detalle está en el documento 37.

Gestión de no conformidades

Un único proceso para todas las desviaciones. Solo el auditor de IA puede cerrar una no conformidad



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

Tipo	Ejemplos	Contención	Plan de acción	Informa a
Crítica	Sistema en producción sin <i>gate</i> aprobado; práctica prohibida; incidente grave sin notificar; control crítico desactivado.	Inmediata (máximo 48 horas), incluida la parada del sistema si es necesario.	Máximo 10 días.	Comité de IA y comisión delegada del consejo.
Mayor	Evidencias elaboradas a posteriori; autoaprobación; condición vencida en un control relevante; revisión de continuidad omitida.	Máximo 10 días.	Máximo 30 días.	Comité de IA.
Menor	Evidencia incompleta sin impacto en la decisión; retraso en la actualización de registros.	No requerida.	Antes del siguiente <i>gate</i> o revisión.	Oficina de IA.

Los plazos son de referencia y la compañía puede ajustarlos en C2, sin superar los que establezca la regulación aplicable.

13

Regulación y normas de referencia

SEVEN-G **mapea** la regulación en lugar de incrustarla: cada obligación se vincula a una fase, un rol y una evidencia. Así, cuando la norma cambia, se actualiza el mapeo sin rehacer el marco. El mapeo detallado está en el documento 34.

Referencia	Encaje principal en SEVEN-G
Reglamento Europeo de IA	Clasificación por nivel de riesgo y prácticas prohibidas (fase 3); gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registros, transparencia, supervisión humana, precisión y robustez (fases 3 a 6); alfabetización en IA del personal (C2 y personas); vigilancia posterior a la comercialización y notificación de incidentes graves (fase 6).
ISO/IEC 42001 (sistema de gestión de IA)	El ciclo corporativo actúa como sistema de gestión: contexto y liderazgo (C1–C2), planificación (C2–C3), operación (ciclo de vida), evaluación del desempeño (C4–C5) y mejora (C5 y no conformidades).
NIST AI RMF	Gobernar (ciclo corporativo y roles), mapear (fases 1–3), medir (fases 2, 5 y 6) y gestionar (fases 3–7).
RGPD	Base legal y minimización de datos (fase 3), evaluación de impacto en protección de datos (fases 3–4), derechos de los interesados y decisiones automatizadas (fases 4–6).

Referencia	Encaje principal en SEVEN-G
DORA y NIS2 , cuando apliquen	Riesgo de proveedores tecnológicos (fases 3–4), gestión y notificación de incidentes (fase 6), resiliencia de funciones críticas (criterio Enterprise).
Regulación sectorial	Se incorpora en la declaración de contexto (fase 0) y en el mapeo regulatorio de la compañía.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico. La clasificación regulatoria de cada sistema debe realizarse con criterio jurídico cualificado.

14

Cómo se declara que se aplica SEVEN-G

Una organización puede declarar que aplica SEVEN-G cuando cumple, como mínimo, las siguientes condiciones:

1. Ha completado C1 y C2, y tiene aprobados por el consejo la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo.
2. Mantiene un inventario de sistemas de IA con clasificación regulatoria, intensidad y responsable, y un registro de iniciativas con la trazabilidad de la sección 6.11.
3. Ha asignado los roles y órganos con las incompatibilidades de la sección 8.2.
4. Todas las iniciativas nuevas recorren el ciclo de vida con sus *gates* registrados.
5. Todas las iniciativas en producción tienen revisión de continuidad vigente.
6. Aplica las reglas de medición del valor y reporta al consejo con el panel de supervisión.
7. Gestiona las no conformidades con el proceso de la sección 12.

Las iniciativas en producción anteriores a la adopción del marco deben regularizarse en un plazo aprobado en C2, pasando por una revisión de continuidad equivalente a G7.

15

Documentos relacionados

Documento	Relación con este documento
00 · Qué es SEVEN-G y para qué sirve	Presentación del marco y reglas de medición del valor.

Documento	Relación con este documento
02 · Glosario	Definiciones completas de los términos.
03 · Herramientas y registro de iniciativas	Registro de iniciativas, métricas del embudo, modelo de datos y catálogo de herramientas.
10 · Mapa de esferas y niveles de ambición	Componente A.
11 · Modelo de madurez	Diagnóstico en C1 y C5.
12 · Índice de transformación	Clasificación de ambición y perfil de la compañía.
13 · Tesis de IA y apetito de riesgo	Resultados de C2.
14 · Gestión de cartera	Resultados de C3 y criterios de retirada.
20 · Manuales de fase	Desarrollo operativo de las fases 0–7.
21 · Criterios de <i>gate</i> y de auditoría	Criterios detallados por puerta, intensidad y ambición.
22 · Listas de verificación	Controles binarios por <i>gate</i> .
30 · Modelo de gobierno	Desarrollo de roles, órganos y escalado.
33 · Metodología de riesgos de IA	Matriz, registro y riesgos tipo.
34 · Mapeo regulatorio	Obligación por obligación.
35 · Seguridad de IA y agentes	Controles específicos de agentes y exposición a ataques.
37 · No conformidades e incidentes	Desarrollo del proceso de la sección 12.
40 · Reglas de medición del valor	Desarrollo del sistema de medición.
90 · Guía de implantación	Primeros noventa días y regularización.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Consolida la metodología fundacional anterior y los criterios de <i>gate</i> en un único modelo; incorpora el ciclo corporativo, los criterios diferenciados por nivel de ambición, la determinación de intensidad, la firma multinivel de puesta en producción, la tabla de incompatibilidades, los plazos de no conformidades, el encaje regulatorio y la trazabilidad del ciclo de vida como embudo.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2 / NIS2) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

Marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1 · <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10> · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-01-2023
